

Surya Tesori & Accessori

Documentazione di Project Management

Indice

1. Introduzione	3
1.1 Descrizione dell'approccio	3
1.2 Contesto e dominio	7
2. Avvio e definizione del progetto	12
2.1 Scoping meeting e Conditions of Satisfaction	12
2.2 Project Overview Statement - POS	16
2.3 Project Definition Statement - PDS	20
3. Analisi e pianificazione	26
3.1 Business Case e analisi delle alternative	26
3.2 Requirements Breakdown Structure - RBS	33
3.3 Project Management Life Cycle - PMLC	37
3.4 Work Breakdown Structure - WBS	41
3.5 Stime tempi, risorse e costi	47
3.6 Gantt e Project Network	51
4. Governance e controllo	58
4.1 Analisi dei rischi	58
4.2 Matrice responsabilità RASCI	64
4.3 Piano comunicazione e Scope Change Management	69
4.4 Monitoraggio e Controllo di qualità	72
4.5 Issue Log e Trello	76
5. Esecuzione e chiusura	80
5.1 Launching ed Execution	80
5.2 Closing	86
5.3 Final Project Report	91

1. Introduzione

1.1 Descrizione dell'approccio

1.1.1 1. Premessa

Il progetto *Progetto di valutazione, pianificazione e lancio dell'e-commerce Surya Shop* viene trattato come un progetto di Project Management applicato a un'iniziativa software/retail digitale.

Surya Tesori Accessori possiede tre store fisici e intende valutare l'apertura di un e-commerce proprietario. Il progetto deve rispondere a una domanda manageriale concreta: l'investimento conviene e quale soluzione permette di ottenere il miglior equilibrio tra tempi, costi, rischi e coerenza con il brand?

La soluzione raccomandata è Shopify, ma la scelta viene motivata attraverso un confronto strutturato con e-commerce custom, WooCommerce, marketplace/social commerce e opzione "do nothing".

1.1.2 2. Perché il progetto è gestito come progetto software/retail digitale

L'e-commerce è un progetto software perché richiede una piattaforma digitale, un checkout, pagamenti, spedizioni, analytics, gestione catalogo e integrazioni. Tuttavia, per Surya non si tratta solo di tecnologia. Il progetto coinvolge anche:

- Modello commerciale;
- Gestione catalogo;
- Customer care;
- Fotografia e storytelling;
- Processo ordini e resi;
- Formazione interna;
- Marketing digitale;
- Privacy e cookie policy;
- Misurazione dei risultati.

La piattaforma è quindi uno strumento a supporto del nuovo canale commerciale, non il fine del progetto.

1.1.3 3. Ciclo di vita scelto

Il progetto adotta un **approccio ibrido**:

- **predittivo** per planning, budget, milestone, rischi, responsabilità e criteri di accettazione;
- **agile/incrementale** per configurazione Shopify, caricamento catalogo, contenuti, test UX e miglioramenti progressivi.

Questa scelta è coerente con una durata MVP di **10 settimane**, un budget setup/lancio di **10.000 euro** e una sola persona interna da formare. Il progetto deve essere snello, controllato e orientato al rilascio.

1.1.4 4. Motivazione dell'approccio ibrido

Un approccio totalmente waterfall sarebbe troppo rigido perché contenuti, schede prodotto, fotografie e layout devono essere verificati progressivamente. L'esperienza di acquisto online richiede test reali e correzioni rapide.

Un approccio totalmente agile sarebbe rischioso perché il budget è contenuto e il go-live è fissato al **1 giugno 2026**. Senza confini chiari, il progetto potrebbe accumulare richieste non essenziali come loyalty, multilingua, integrazione POS o personalizzazioni avanzate.

L'approccio ibrido permette di:

- Fissare obiettivi e scadenze;
- Proteggere lo scope MVP;
- Controllare costi e rischi;
- Iterare su contenuti e UX;
- Lanciare rapidamente;
- Rimandare le funzionalità evolutive a una roadmap post-MVP.

1.1.5 5. Fasi del progetto

5.1 Scoping/Initiating

Questa fase serve a chiarire opportunità, vincoli e condizioni di soddisfazione. È svolta tra fine marzo e inizio aprile 2026.

Output principali:

- Meeting di scoping;
- Conditions of Satisfaction;
- Project Overview Statement;
- Definizione delle alternative da analizzare.

5.2 Planning

La fase di planning traduce gli obiettivi in un piano gestibile.

Output principali:

- Business Case;
- analisi alternative;
- RBS;
- WBS;
- Gantt;
- Pert;
- Stime tempi/costi/risorse;
- Risk Register;
- RASCI;
- Piano comunicazione;
- PDS.

5.3 Launching/Execution

La fase operativa parte dal 1 aprile 2026 e include configurazione Shopify, tema, catalogo, pagamenti, spedizioni, policy, analytics, test e formazione.

Output principali:

- Ambiente Shopify configurato;
- Tema adattato;
- 150 prodotti caricati;
- Pagamenti e spedizioni impostati;
- Privacy/cookie/policy pubblicate;
- Analytics attivo;
- Formazione del proprietario più giovane;
- Soft launch;
- Go-live pubblico del 1 giugno 2026.

5.4 Monitoring & Controlling

Il controllo avviene durante tutto il progetto, con particolare attenzione a:

- Avanzamento WBS;
- Budget setup;
- Costi ricorrenti annui;
- Completamento catalogo;
- Issue critiche;
- Test checkout;
- Readiness go-live.

Dopo il go-live, il monitoraggio formale dura 2 settimane, dal 1 al 15 giugno 2026.

5.5 Closing

La chiusura formalizza:

- Accettazione deliverable;
- Handover al proprietario formato;
- Chiusura issue critiche;
- Report post-lancio;
- Lezioni apprese;
- Roadmap futura.

1.1.6 6. Differenza tra gestione del progetto e implementazione tecnica

La gestione del progetto riguarda decisioni, pianificazione, responsabilità, costi, rischi e qualità. L'implementazione tecnica riguarda invece la configurazione della piattaforma.

Nel caso Surya, il Project Manager deve garantire che:

- Le alternative siano valutate;
- Lo scope sia realistico;
- Il budget sia rispettato;
- Shopify sia configurato in modo adeguato;
- Il catalogo MVP sia pronto;
- Il proprietario formato sia autonomo;
- I risultati siano misurabili;
- Le evoluzioni future siano governate.

1.1.7.7. Documenti prodotti

Documento	Funzione
Approccio	Spiega metodo e ciclo di vita
Contesto e dominio	Descrive Surya, settore e glossario
Scoping e CoS	Formalizza bisogni e condizioni di soddisfazione
POS	Sintetizza opportunità, obiettivi e vincoli
Business Case	Valuta convenienza e alternative
RBS	Scompone i requisiti
PMLC	Definisce ciclo di vita
WBS	Scompone il lavoro
Stime	Quantifica tempi, risorse e costi
Gantt	Pianifica attività e milestone
Pert	Evidenzia percorso critico e le inter-dipendenze tra le attività
Rischi	Identifica e mitiga incertezze
PDS	Formalizza scope e accettazione
Execution	Definisce regole operative
RASCI	Assegna responsabilità
Comunicazione/change	Governa comunicazioni e modifiche
Monitoring	Definisce KPI e report
Issue/Trello	Gestisce problemi e flusso lavoro
Closing	Chiude formalmente il progetto
Final report	Riassume risultati e decisione finale

1.2 Contesto e dominio

1.2.1 1. Descrizione di Surya Tesori Accessori

Surya Tesori Accessori è un brand italiano che crea gioielli e accessori moda pensati per esprimere personalità, carattere e unicità.

Ogni collezione nasce da una ricerca continua di forme, materiali e dettagli, con l'obiettivo di accompagnare ogni donna nei diversi momenti della quotidianità. Le creazioni sono versatili e distintive, ideate per adattarsi a stili diversi e valorizzare ogni identità.

Da oltre 20 anni l'azienda viaggia il mondo alla ricerca di ispirazioni, tradizioni e materiali, unendo culture lontane in uno stile contemporaneo e autentico. La storia del brand nasce dall'incontro tra passione, esperienza e ricerca dell'eccellenza.

Ogni creazione riflette lavorazioni artigianali, cura manuale e attenzione ai materiali. Il valore di Surya non è soltanto nel prodotto, ma anche nel racconto che accompagna ogni pezzo.

1.2.2 2. Settore gioielli e accessori moda artigianali

Il settore degli accessori moda artigianali presenta alcune caratteristiche rilevanti:

- Forte importanza di immagini e dettagli visivi;
- Necessità di raccontare materiali, lavorazioni e ispirazioni;
- Collezioni soggette a stagionalità e trend;
- Valore percepito legato a unicità e artigianalità;
- Rilevanza della fiducia nel processo di acquisto online;
- Necessità di policy chiare su spedizioni e resi;
- Ruolo importante dei social media nella scoperta del brand.

Nel negozio fisico il cliente può osservare, toccare e provare il prodotto. Online queste componenti devono essere sostituite da fotografie curate, descrizioni complete, navigazione semplice e checkout affidabile.

1.2.3 3. Posizionamento del brand

Surya si posiziona come brand artigianale, distintivo e femminile. Non compete principalmente sul prezzo, ma su:

- Unicità;
- Selezione dei materiali;
- Cura del dettaglio;
- Ispirazioni internazionali;
- Lavorazione manuale;
- Autenticità del racconto;
- Capacità di valorizzare l'identità personale.

Il sito e-commerce deve quindi evitare un'impostazione solo transazionale. Deve vendere, ma anche trasferire online la sensibilità del brand.

1.2.4 4. Store fisici

Surya ha tre store fisici in Italia:

Store	Ruolo nel progetto
Riccione	Punto vendita con forte visibilità e potenziale clientela turistica
Misano	Store utile per feedback operativo su prodotti e disponibilità
Cattolica	Store principale e punto vendita rilevante per presidio locale e relazione cliente

Gli store fisici restano centrali. L'e-commerce non li sostituisce, ma amplia la relazione con clienti che non vivono nelle località presidiate o che desiderano riacquistare online dopo aver conosciuto il brand in negozio.

1.2.5 5. Motivazioni dell'espansione online

Surya valuta l'e-commerce per:

- Aumentare la copertura geografica;
- Aumentare la clientela;
- Valorizzare online lo storytelling artigianale;
- Ampliare il brand tramite uno store digitale;
- Raccogliere dati commerciali;
- Migliorare gestione catalogo, ordini e campagne;
- Verificare la convenienza economica del canale online;
- Costruire una base per future evoluzioni multi-canale.

1.2.6 6. Attori principali


Preciso che essendo piccola impresa retail-artigianale con struttura familiare e tre store fisici, i soggetti coinvolti possono ricoprire più ruoli.

Attore	Interesse	Responsabilità
Proprietà Surya	Valutare investimento e strategia	Approvazione budget, scope e go-live
E-commerce specialist	Gestione operativa e-commerce	Formazione, catalogo, ordini, report
Store manager	Conoscenza prodotti e clienti	Feedback su stock e prodotti
Addetti vendita	Supporto informale su prodotto	Informazioni prodotto e customer care
Project Manager	Governance progetto	Tempi, costi, rischi, deliverable
Business Analyst	Analisi requisiti e processi	Business Case e requisiti
Shopify Specialist	Configurazione piattaforma	Setup, checkout, pagamenti, spedizioni
UX/UI Designer	Coerenza visiva	Tema, navigazione, mobile
Content/Product Specialist	Contenuti prodotto	Schede, immagini, storytelling
SEO/Marketing Specialist	Visibilità e misurazione	SEO base, analytics, lancio
Legal/GDPR Consultant	Compliance	Privacy, cookie, condizioni vendita
Clienti finali	Acquisto online	Feedback e ordini
Corrieri	Consegna ordini	Spedizioni e tracking
Payment provider	Pagamenti	Transazioni e sicurezza

1.2.7 7. Organigramma aziendale

L'organigramma aziendale di Surya Tesori Accessori evidenzia una struttura familiare e snella. Al vertice si trova la CEO **Rosetta Scanu**. La governance è condivisa con **Roberto Caldari** e con il figlio **Edoardo Caldari**.

Dal punto di vista operativo, l'impresa si basa su una struttura retail composta da store manager e addetti vendita, il cui numero può variare in base alla stagionalità. Nel progetto e-commerce, la figura dell'**E-commerce Specialist**, raffigurata da Edoardo, assume un ruolo centrale nella gestione operativa del canale online, in particolare per catalogo, ordini, report e coordinamento con i fornitori esterni.

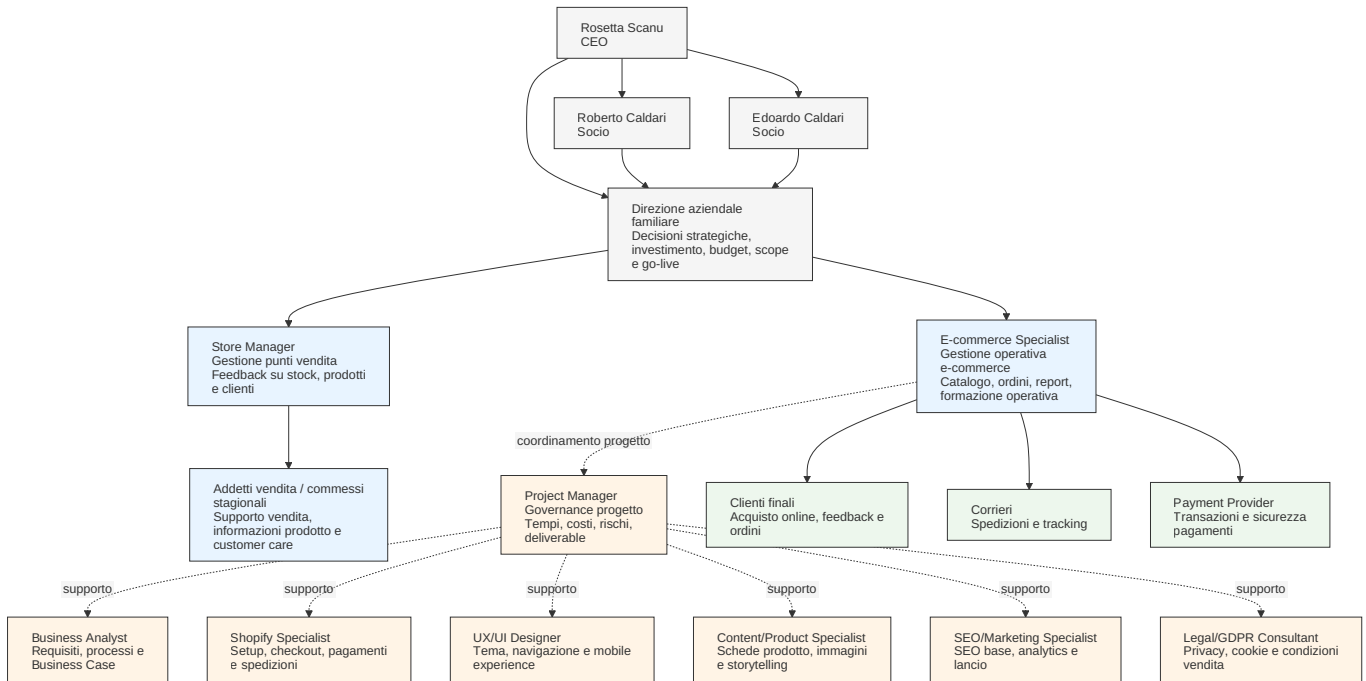


1.2.8 8. Glossario del dominio

Termini	Definizione
Collezione	Insieme di prodotti accomunati da tema, stile, stagione o materiale
Pezzo artigianale	Creazione realizzata a mano, con valore legato a unicità e cura
Variante	Differenza di colore, misura, materiale o finitura
SKU	Codice identificativo di prodotto o variante
Stock	Quantità disponibile per la vendita
Lookbook	Raccolta visuale di prodotti indossati o ambientati
Scheda prodotto	Pagina con immagini, descrizione, prezzo, varianti e CTA
Checkout	Processo di completamento ordine e pagamento
Fulfillment	Preparazione, imballaggio e spedizione ordine
Reso	Restituzione prodotto secondo condizioni definite
Multi-Canalità	Integrazione tra store fisici e canale digitale
Conversion rate	Percentuale di visitatori che acquistano
Carrello medio	Valore medio degli ordini
MVP	Versione iniziale funzionante con funzionalità essenziali
Soft launch	Lancio controllato prima della pubblicazione pubblica
Analytics	Raccolta e analisi dei dati di traffico e vendita

1.2.9 9. Catena del valore di Porter applicata a un prodotto Surya

Per comprendere meglio il dominio operativo di Surya Tesori Accessori, è utile rappresentare il percorso attraverso cui un prodotto artigianale entra nell'assortimento aziendale e arriva alla vendita negli store fisici o, in prospettiva, nel canale e-commerce.

La catena del valore di Porter permette di distinguere le attività primarie che generano valore per il cliente finale. Nel caso Surya, il valore non nasce solo dalla vendita del prodotto, ma dall'intero processo di ricerca, selezione, relazione con i fornitori, cura artigianale, importazione, presentazione e racconto del prodotto.



2. Avvio e definizione del progetto

2.1 Scoping meeting e Conditions of Satisfaction

2.1.1 1. Premessa

La fase di scoping chiarisce obiettivi, vincoli, alternative e Conditions of Satisfaction. I meeting sono reali e coerenti con l'avvio del progetto il **1 aprile 2026**.

2.1.2 2. Meeting & Scoping

Meeting 1 — Avvio valutazione strategica

Campo	Dettaglio
Data	23 marzo 2026
Luogo	Store Surya Riccione
Partecipanti	Proprietà Surya, E-commerce specialist, Project Manager, Business Analyst
Obiettivo	Comprendere motivazioni e vincoli dell'iniziativa e-commerce
Ordine del giorno	Obiettivi, budget, tempi, alternative, ruolo del canale online

SINTESI

La proprietà ha espresso l'esigenza di vendere oltre le città in cui sono presenti gli store e di valorizzare online il racconto artigianale. È emersa una forte attenzione al contenimento dei costi e alla semplicità operativa.

Il Project Manager ha chiarito l'importanza che il progetto non è "fare un sito", ma valutare, pianificare e governare l'introduzione di un nuovo canale digitale.

DECISIONI

- Avvio progetto fissato al 1 aprile 2026.
- Go-live fissato al 1 giugno 2026.
- Durata MVP: 10 settimane, includendo stabilizzazione iniziale.
- Budget target setup/lancio: 10.000 euro.
- Budget massimo annuale ricorrente: 3.000 euro/anno.
- Shopify considerata soluzione raccomandata da validare con Business Case.

OUTPUT

- Prima baseline di progetto.
- Elenco alternative.
- Vincoli iniziali.

Meeting 2 – Catalogo, contenuti e gestione operativa

Campo	Dettaglio
Data	25 marzo 2026
Luogo	Store Surya Cattolica
Partecipanti	Project Manager, E-commerce specialist, Store Manager, Content Specialist
Obiettivo	Valutare catalogo, contenuti e capacità operativa interna
Ordine del giorno	150 prodotti MVP, immagini, descrizioni, SKU(stock-keeping unit), stock, formazione

SINTESI

Surya dispone di prodotti sufficienti per avviare il catalogo MVP, ma non tutte le informazioni sono già strutturate per l'e-commerce. L'E-commerce specialist sarà l'unica persona formata in modo completo, con responsabilità operativa su catalogo, ordini e report.

La sua competenza informatica è nella media: questo rende necessaria una piattaforma semplice, guidata e non dipendente da interventi tecnici continui.

DECISIONI

- Catalogo iniziale: 150 prodotti.
- Formazione completa limitata a 1 persona.
- Utilizzo di template standard per schede prodotto.
- Esclusione dal MVP dei prodotti senza immagini o dati minimi.
- Shopify preferibile per semplicità di gestione.

OUTPUT

- Standard scheda prodotto.
- Rischio "catalogo incompleto".
- Rischio "single point of knowledge" sulla persona formata.

Meeting 3 – Valutazione alternative tecnologiche

Campo	Dettaglio
Data	27 marzo 2026
Luogo	Meeting online
Partecipanti	Project Manager, Business Analyst, Shopify Specialist, UX/UI Designer, Proprietà Surya
Obiettivo	Confrontare Shopify, custom, WooCommerce, marketplace/ social commerce e do nothing
Ordine del giorno	Tempi, costi, rischio tecnico, autonomia, manutenzione, scalabilità

SINTESI

La soluzione custom è stata giudicata non coerente con budget e tempi. WooCommerce è stata considerata valida ma più impegnativa sul piano tecnico e manutentivo. Marketplace e social commerce sono stati riconosciuti come canali di supporto, non come sostituti del canale proprietario.

Shopify è emerso come soluzione più adatta perché riduce il time-to-market e consente al proprietario formato di gestire attività ordinarie senza competenze tecniche avanzate.

DECISIONI

- Business Case con matrice ponderata.
- Shopify da raccomandare se conferma vantaggi su tempi, costi e autonomia.
- Limiti Shopify da esplicitare: canoni, app, dipendenza piattaforma, personalizzazione limitata.

OUTPUT

- Criteri di valutazione.
- Bozza matrice alternative.
- Raccomandazione preliminare Shopify.

Meeting 4 – Validazione Conditions of Satisfaction

Campo	Dettaglio
Data	31 marzo 2026
Luogo	Store Surya Misano
Partecipanti	Proprietà Surya, Project Manager, Business Analyst, Legal/GDPR Consultant
Obiettivo	Validare POS, budget, tempi e Conditions of Satisfaction
Ordine del giorno	Approvazione baseline, GDPR, MVP, formazione, KPI, go-live

SINTESI

La proprietà ha confermato che il progetto deve essere sostenibile e non trasformarsi in un investimento tecnico complesso. Il Legal/GDPR Consultant ha segnalato l'importanza di includere privacy, cookie policy e condizioni vendita già nello scope MVP.

DECISIONI

- POS approvato.
- Avvio operativo il 1 aprile 2026.
- Go-live il 1 giugno 2026.
- Budget setup/lancio target 10.000 euro.
- Budget ricorrente massimo 3.000 euro/anno.
- Formazione di 1 persona interna.
- Monitoraggio post-lancio di 2 settimane.

OUTPUT

- POS approvato.
- Conditions of Satisfaction definitive.
- Autorizzazione alla fase di execution.

2.1.3 3. Domande di approfondimento e risposte

Domanda	Risposta	Implicazione
Perché aprire un e-commerce?	Per vendere oltre gli store e mantenere contatto con clienti.	Il canale deve essere proprietario e misurabile.
Il catalogo è pronto?	Parzialmente, ma servono schede strutturate.	Attività catalogo critica.
Quante persone saranno formate?	Una: E-commerce specialist.	Serve piattaforma semplice.
Qual è il budget di setup?	10.000 euro.	Scope MVP molto controllato.
Qual è il budget annuale ricorrente?	Massimo 3.000 euro/anno.	Limitare app e costi fissi.
Vendita internazionale subito?	No.	Esclusa dal MVP.
È prioritario integrare i POS fisici?	Non nel primo rilascio.	Roadmap futura.
Marketplace come canale principale?	No, serve controllo del brand.	Marketplace solo complementari.

2.1.4 4. Conditions of Satisfaction

ID	Condition of Satisfaction	Criterio di verifica
CoS-01	Budget setup/lancio rispettato	Target 10.000 euro
CoS-02	Budget ricorrente controllato	Non oltre 3.000 euro/anno per costi ricorrenti essenziali
CoS-03	Go-live entro data fissata	Pubblicazione il 1 giugno 2026
CoS-04	MVP funzionante	Sito navigabile, catalogo attivo, checkout operativo
CoS-05	Catalogo iniziale	150 prodotti caricati
CoS-06	Formazione interna	1 persona formata su catalogo, ordini e report
CoS-07	GDPR e cookie policy	Privacy, cookie e condizioni vendita pubblicate
CoS-08	Pagamenti integrati	Ordini test completati
CoS-09	Spedizioni configurate	Tariffe e policy resi attive
CoS-10	UX coerente con brand	Home, collezioni e schede prodotto approvate
CoS-11	Misurabilità	Analytics attivo dal go-live
CoS-12	Riduzione rischio tecnico	Nessuno sviluppo custom critico
CoS-13	Evoluzione futura	Roadmap post-MVP definita
CoS-14	Monitoraggio post-lancio	Report dopo 2 settimane

2.2 Project Overview Statement - POS

2.2.1 1. Project Name

Progetto di valutazione, pianificazione e lancio dell'e-commerce Surya Shop

2.2.2 2. Opportunity

Surya Tesori Accessori ha tre store fisici in Italia e un'identità distintiva basata su artigianalità, ricerca dei materiali e storytelling. L'assenza di un e-commerce proprietario limita la possibilità di raggiungere clienti fuori da Riccione, Misano e Cattolica oltre al turismo estivo che queste città offrono.

L'opportunità consiste nel lanciare un canale digitale proprietario, sostenibile e misurabile, capace di:

- Ampliare la copertura geografica;
- Valorizzare online il brand;
- Vendere anche a clienti non locali o turisti estivi;
- Raccogliere dati commerciali;
- Integrare progressivamente fisico e digitale;
- Testare la domanda online con investimento controllato.

2.2.3 3. Problem/Need

Il modello attuale basato sui soli store fisici presenta limiti:

- Dipendenza dalla presenza locale;
- Difficoltà nel mantenere relazione con clienti turistici o distanti;
- Assenza di dati digitali strutturati;
- Minore capacità di misurare campagne;
- Rischio competitivo rispetto a brand già presenti online;
- Mancanza di un canale proprietario di vendita digitale.

Il bisogno è introdurre un e-commerce che sia sostenibile per una piccola realtà retail-artigianale, con budget limitato e senza reparto IT interno.

2.2.4 4. Project Goal

Valutare, pianificare e lanciare un MVP (Minimum Viable Product) e-commerce proprietario per Surya Tesori Accessori, individuando la soluzione più adatta tra Shopify, custom, WooCommerce, marketplace/social commerce e mantenimento del solo canale fisico.

La soluzione raccomandata è Shopify.

2.2.5 5. Project Objectives

ID	Obiettivo	Descrizione
OBJ-01	Valutare convenienza	Analizzare costi, benefici e rischi dell'e-commerce
OBJ-02	Confrontare alternative	Shopify, custom, WooCommerce, marketplace, do nothing
OBJ-03	Definire modello operativo	Catalogo, ordini, spedizioni, resi, customer care
OBJ-04	Configurare MVP Shopify	Piattaforma, tema, pagamenti, spedizioni, analytics
OBJ-05	Caricare catalogo	150 prodotti iniziali
OBJ-06	Formare una risorsa interna	Edoardo Caldari, formato su gestione base
OBJ-07	Lanciare il canale	Go-live pubblico il 1 giugno 2026
OBJ-08	Monitorare risultati	2 settimane di KPI post-lancio
OBJ-09	Definire roadmap futura	Multi-Platform, loyalty, stock, marketing

2.2.6 6. Success Criteria misurabili

ID	Criterio	Target
SC-01	Avvio progetto	1 aprile 2026
SC-02	Go-live	1 giugno 2026
SC-03	Durata MVP	10 settimane, inclusa stabilizzazione iniziale
SC-04	Budget setup/lancio	10.000 euro target
SC-05	Budget ricorrente annuo	Massimo 3.000 euro/anno
SC-06	Catalogo MVP	150 prodotti caricati
SC-07	Formazione	1 persona Surya formata
SC-08	Checkout	Almeno 3 ordini test completati
SC-09	Analytics	Tracciamento attivo dal go-live
SC-10	Autonomia operativa	Proprietario formato in grado di modificare prodotti e leggere ordini
SC-11	Break-even ipotetico	12-18 mesi
SC-12	Issue critiche	0 issue critiche aperte al go-live

2.2.7 7. Assunzioni

- Surya non dispone di reparto IT interno.
- Edoardo può dedicare tempo alla formazione e gestione base.

- Il catalogo MVP è limitato a 150 prodotti.
- La vendita iniziale è limitata all'Italia.
- Lo stock real-time con store fisici non è incluso nel MVP.
- Il budget setup/lancio è pari a 10.000 euro.
- Il budget ricorrente massimo è pari a 3.000 euro/anno.
- Shopify è una delle alternative prioritarie da validare.
- I dati economici e di vendita sono ipotesi progettuali.

2.2.8 8. Vincoli

Vincolo	Descrizione
Tempo	Go-live il 1 giugno 2026
Budget setup	Target 10.000 euro
Budget ricorrente	Massimo 3.000 euro/anno
Risorse interne	Una sola persona formata
Competenze IT	Media, non specialistica
Scope	MVP essenziale, senza funzionalità avanzate
Compliance	GDPR, cookie e condizioni vendita obbligatorie
Brand	Esperienza coerente con posizionamento artigianale

2.2.9 9. Rischi iniziali

Rischio	Sintesi
Catalogo incompleto	150 prodotti potrebbero richiedere più lavoro del previsto
Fotografie non uniformi	Rischio impatto su qualità percepita
Budget limitato	Necessità di escludere funzionalità non essenziali
Una sola persona formata	Rischio dipendenza interna
GDPR/cookie	Ritardi su policy
App Shopify	Rischio costi ricorrenti superiori al budget annuo
Stock fisico/online	Possibili disallineamenti
Traffico iniziale basso	Necessità di marketing post-lancio
Scope creep	Richieste evolutive non compatibili con budget e tempi
Dipendenza centralizzata	Rischio di avere lo store online in down a causa di problemi sulla piattaforma

2.2.10 10. Alternative considerate

Alternativa	Sintesi
Shopify	Raccomandata per rapidità, semplicità, ecosistema e autonomia
Custom	Non coerente con budget e tempi, alto rischio tecnico
WooCommerce	Valida ma più impegnativa su manutenzione e sicurezza
Marketplace/social commerce	Supporto utile, non canale principale
Do nothing	Riduce costi immediati ma limita crescita e dati

2.2.11 11. Raccomandazione preliminare

La raccomandazione preliminare è procedere con Shopify. Con un budget setup/lancio di 10.000 euro e una sola persona interna da formare, Shopify è la soluzione più coerente perché permette di evitare sviluppo custom, ridurre manutenzione tecnica e concentrare lo sforzo su catalogo, contenuti, pagamenti, spedizioni e misurazione.

2.3 Project Definition Statement - PDS

2.3.1 1. Premessa

Il Project Definition Statement formalizza scope, deliverable, criteri di accettazione, milestone, budget e change management del progetto Surya Shop.

Il PDS deriva dal POS approvato il 31 marzo 2026.

2.3.2 2. Project Name

Progetto di valutazione, pianificazione e lancio dell'e-commerce Surya Shop

2.3.3 3. Scope incluso

Il progetto include:

- Valutazione della convenienza dell'e-commerce;
- Confronto alternative;
- Raccomandazione Shopify;
- Configurazione MVP Shopify;
- Scelta e adattamento tema base;
- Struttura catalogo;
- Caricamento di 150 prodotti;
- Configurazione pagamenti;
- Configurazione spedizioni Italia;
- Policy resi e condizioni vendita;
- Privacy e cookie policy;
- SEO base;
- Analytics;
- Test checkout, mobile e contenuti;
- Formazione E-commerce specialist (Edoardo);
- Soft launch;
- Go-live pubblico il 1 giugno 2026;
- Stabilizzazione iniziale;
- Monitoraggio post-lancio di 2 settimane;
- Report finale.

2.3.4 4. Scope escluso

Sono esclusi dal MVP:

- Sviluppo custom avanzato;
- Vendita internazionale;
- Multilingua;
- Integrazione POS fisici;
- Sincronizzazione stock real-time;
- Programma loyalty;
- App recensioni avanzata;
- Lookbook interattivo avanzato;
- App mobile;
- CRM evoluto;
- Automazioni marketing;
- Campagne pubblicitarie significative;
- Shooting fotografico esteso.

2.3.5 5. Deliverable

ID	Deliverable	Descrizione
D1	Business Case	Analisi convenienza e alternative
D2	Matrice decisionale	Valutazione ponderata
D3	PDS	Definizione progetto
D4	Shopify configurato	Ambiente pronto
D5	Tema adattato	UX base coerente
D6	Catalogo MVP	150 prodotti
D7	Pagamenti	Checkout testato
D8	Spedizioni/resi	Tariffe e policy
D9	GDPR/cookie	Documenti e banner
D10	SEO/analytics	Tracciamenti base
D11	Test report	Evidenza test
D12	Manuale operativo	Guida sintetica
D13	Formazione	Proprietario formato
D14	Soft launch	Test controllato
D15	Go-live	Pubblicazione 1 giugno
D16	Report post-lancio	KPI dopo 2 settimane

2.3.6 6. Criteri di accettazione

Business Case

- Include tutte le alternative.
- Motiva Shopify con criteri oggettivi.
- Esplicita costi, rischi e limiti.
- Rispetta ipotesi di budget.

MVP Shopify

- Sito navigabile da desktop e mobile.
- Tema coerente con brand.
- Checkout operativo.
- Nessuna issue critica al go-live.

Catalogo

- 150 prodotti caricati.
- Schede complete almeno con titolo, descrizione, prezzo, immagini e disponibilità.
- Prodotti organizzati in collezioni.
- Errori critici su prezzo/variante assenti.
- Politiche SEO.

Pagamenti

- Apertura conto bancario.
- Metodi pagamento attivi.
- Almeno 3 ordini test completati.
- Email transazionali verificate.

Spedizioni

- Spedizioni Italia configurate.
- Tariffe visibili.
- Policy resi pubblicata.
- Processo fulfillment definito.

GDPR

- Privacy policy pubblicata.
- Cookie policy pubblicata.
- Cookie banner attivo.
- Condizioni vendita pubblicate.

Analytics

- Analytics attivo.
- Eventi principali monitorabili.
- Dashboard base leggibile dall'e-commerce specialist.

Formazione

- Una persona formata.
- Esercitazione su prodotto completata.
- Esercitazione su ordine completata.
- Manuale consegnato.

Go-live

- Soft launch completato.
- Issue critiche chiuse.
- Approvazione proprietà.
- Monitoraggio post-lancio attivo.

2.3.7 7. Milestone

Milestone	Data
POS approvato	31 marzo 2026
Avvio progetto	1 aprile 2026
Shopify confermato	7 aprile 2026
Setup Shopify base	21 aprile 2026
Pagamenti/spedizioni	8 maggio 2026
Catalogo MVP	15 maggio 2026
Apertura conto bancario	18 maggio 2026
Test completati	22 maggio 2026
Formazione completata	22 maggio 2026
Soft launch	25 maggio 2026
Go-live	1 giugno 2026
Stabilizzazione MVP	10 giugno 2026
Report post-lancio	15 giugno 2026

2.3.8 8. Budget

Voce	Importo
Budget setup/lancio target	10.000 euro
Budget annuale ricorrente massimo	3.000 euro/anno
Change budget	Non previsto salvo approvazione separata
Campagne pubblicitarie rilevanti	Escluse dal budget base
Evoluzioni future	Da valutare separatamente

2.3.9 9. Assunzioni

- L'Ecommerce-Specialist sarà disponibile per formazione e gestione.
- I prodotti MVP sono selezionabili entro aprile.
- Le immagini disponibili sono sufficienti per almeno 150 prodotti.
- Shopify è la piattaforma scelta.
- La vendita è inizialmente limitata all'Italia.
- Le funzionalità avanzate saranno rimandate.

2.3.10 10. Vincoli

- Go-live 1 giugno 2026.
- Budget setup/lancio 10.000 euro.
- Budget ricorrente 3.000 euro/anno.
- Una sola persona formata.
- Assenza di reparto IT.
- Scope MVP essenziale.

2.3.11 11. Change Management

Ogni modifica oltre lo scope deve essere valutata con:

1. Descrizione richiesta;
2. Motivazione;
3. Impatto su tempi;
4. Impatto su costi setup;
5. Impatto su costi ricorrenti;
6. Impatto su rischi;
7. Decisione: approvata, respinta o rinviata.

Richieste come loyalty, multilingua, integrazione POS o personalizzazioni avanzate sono rinviate alla roadmap futura.

2.3.12 12. Qualità

La qualità viene controllata con:

- Checklist catalogo;
- Test mobile;
- Ordini test;
- Revisione policy;
- Verifica analytics;
- Soft launch;
- Formazione pratica.

2.3.13 13. Approvazioni

Deliverable	Approvatore
Business Case	Proprietà Surya
PDS	Proprietà Surya
Tema	Proprietà Surya
Catalogo MVP	E-commerce specialist
GDPR/cookie	Legal/GDPR Consultant
Pagamenti/spedizioni	PM + Shopify Specialist
Go-live	Proprietà Surya
Report finale	PM + Proprietà Surya

3. Analisi e pianificazione

3.1 Business Case e analisi delle alternative

3.1.1 1. Premessa

Il business case valuta se Surya Tesori Accessori debba avviare un canale e-commerce proprietario e quale soluzione sia più adatta.

I dati economici sono ipotesi progettuali. Il budget target per setup e lancio è pari a **10.000 euro**. Il budget massimo annuale ricorrente è pari a **3.000 euro/anno**. Questi vincoli rendono necessario un MVP essenziale, senza sviluppo custom complesso.

3.1.2 2. Convenienza dell'e-commerce

L'e-commerce è conveniente per Surya perché consente di superare il limite geografico dei tre store fisici, raccogliere dati commerciali e mantenere relazione con clienti che scoprono il brand nei negozi ma non vivono nelle località presidiate.

I benefici attesi sono:

- Maggiore copertura geografica;
- Canale proprietario di vendita;
- Storytelling artigianale online;
- Raccolta dati su prodotti, visite e ordini;
- Base per newsletter e campagne;
- Validazione della domanda online;
- Progressiva integrazione fisico-digitale;
- Store sempre aperto (h/24).

Il progetto deve però essere proporzionato alla dimensione aziendale. Per questo si raccomanda un MVP Shopify, non una piattaforma custom complessa.

3.1.3 3. Analisi "do nothing"

L'opzione "do nothing" consiste nel mantenere solo i tre store fisici.

Pro

- Nessun investimento immediato.
- Nessuna complessità operativa digitale.
- Nessun costo ricorrente di piattaforma.

Contro

- Copertura geografica limitata.
- Nessuna raccolta dati digitale.
- Mancata valorizzazione online del brand.
- Dipendenza dal traffico fisico.
- Minore relazione con clienti non locali.
- Rischio di ritardo competitivo.
- L'attività ha forte stagionalità turistica, con picco nei mesi estivi.
- Nessuna possibilità di fare analisi automatizzata sulle vendite.

- Minor Brand Identity a livello nazionale.

Valutazione

Il do nothing è conveniente solo nel brevissimo periodo. Nel medio periodo limita crescita, dati e presenza digitale. Non è raccomandato.

3.1.4 4. Alternative

4.1 Shopify

PRO

- Time-to-market rapido.
- Configurazione senza sviluppo da zero.
- Gestione catalogo accessibile a una persona con competenze informatiche medie.
- Ecosistema di temi, app, pagamenti, spedizioni e analytics.
- Buona scalabilità incrementale.
- Maggiore controllo rispetto ai marketplace.
- Coerente con budget contenuto se si limita lo scope.
- Permette di partire con MVP e crescere per step.
- Offre possibilità future di automazioni, newsletter e campagne, da valutare dopo il MVP.

CONTRO

- Canoni ricorrenti.
- Possibili costi per app.
- Dipendenza dalla piattaforma.
- Personalizzazioni avanzate limitate rispetto al custom (parzialmente vero).
- Necessità di controllare il numero di app per restare entro 3.000 euro/anno.

VALUTAZIONE

Shopify è la soluzione raccomandata. È particolarmente adatta perché Surya ha budget limitato, tempi rapidi e una sola persona interna da formare.

4.2 E-commerce custom

PRO

- Massima personalizzazione potenziale.
- Controllo teorico sull'architettura.
- Possibilità di funzioni su misura.

CONTRO

- Costi molto superiori al budget.
- Tempi incompatibili con go-live al 1 giugno 2026.
- Dipendenza da sviluppatore o piccola software house.
- Maggiore rischio bug, manutenzione e sicurezza.
- Difficoltà di gestione autonoma da parte di una sola persona.
- Difficoltà nello sviluppo di automazioni.
- Difficoltà nella gestione di campagne di marketing personalizzate.

VALUTAZIONE

Non raccomandato. Una soluzione custom è sproporzionata rispetto a budget, tempi e risorse interne.

4.3 WooCommerce su WordPress

PRO

- Buona flessibilità.
- Ampio ecosistema plugin.
- Potenziale controllo maggiore rispetto a SaaS.
- Buona integrazione con contenuti editoriali.

CONTRO

- Richiede gestione di hosting, aggiornamenti, plugin e sicurezza.
- Maggior rischio di conflitti plugin.
- Necessità di supporto tecnico continuativo.
- Meno adatto se una sola persona interna deve gestire il canale.
- Costi di manutenzione potenzialmente meno prevedibili.
- Richiede l'assunzione del personale tecnico specializzato.

VALUTAZIONE

WooCommerce è una valida alternativa, ma meno coerente con la necessità di ridurre complessità tecnica e mantenere costi ricorrenti entro 3.000 euro/anno.

4.4 Marketplace/social commerce

PRO

- Avvio rapido.
- Accesso a pubblico esistente.
- Utile per testare prodotti.
- Buon supporto a campagne social.

CONTRO

- Scarso controllo su brand e customer experience.
- Dati cliente limitati.
- Dipendenza da algoritmi e regole esterne.
- Commissioni.
- Concorrenza diretta.
- Non sostituisce un canale proprietario.
- Riduce Brand Identity.

VALUTAZIONE

Marketplace e social commerce sono canali complementari, utili per supportare traffico e visibilità, ma non devono essere il canale principale.

3.1.5 5. Criteri ponderati

Criterio	Peso	Motivazione
Time-to-market	15	Go-live fissato al 1 giugno 2026
Coerenza con budget setup	15	Target 10.000 euro
Coerenza con budget ricorrente	12	Massimo 3.000 euro/anno
Rischio tecnico	14	Assenza reparto IT
Autonomia gestionale	14	Una sola persona formata
Integrazioni	10	Pagamenti, spedizioni, analytics
Controllo brand	8	Brand artigianale e distintivo
Scalabilità progressiva	7	Crescita per step
Manutenzione	5	Sostenibilità operativa
Totale	100	

3.1.6 6. Matrice decisionale

Punteggio da 1 a 5.

Criterio	Peso	Shopify	Custom	WooCommerce	Marketplace /Social	Do nothing
Time-to-market	15	5	1	3	4	1
Budget setup	15	4	1	3	4	5
Budget ricorrente	12	4	2	3	3	5
Rischio tecnico	14	5	1	3	4	5
Autonomia gestionale	14	5	2	3	3	1
Integrazioni	10	5	3	4	2	1
Controllo brand	8	4	5	4	2	3
Scalabilità progressiva	7	4	3	3	2	1
Manutenzione	5	5	2	3	4	5
Totale ponderato	100	461	210	320	320	307

3.1.7 7. Interpretazione

Shopify ottiene il punteggio più alto perché risponde ai vincoli realmente decisivi: tempi brevi, budget limitato, rischio tecnico basso e gestione autonoma da parte di una sola persona.

WooCommerce e marketplace ottengono punteggi intermedi, ma per motivi diversi: WooCommerce è più completo ma più tecnico; marketplace è rapido ma non proprietario. Custom è penalizzato da costi e rischi. Do nothing ha costi bassi ma non risponde agli obiettivi strategici.

3.1.8 8. TCO stimato

Shopify MVP

Voce setup/lancio	Importo ipotetico
Project Management leggero e Business Analysis	1.200 euro
Configurazione Shopify base	2.000 euro
Adattamento tema e UX base	1.000 euro
Supporto catalogo 150 prodotti	2.200 euro
Pagamenti, spedizioni e policy operative	800 euro
GDPR/cookie/termini vendita	700 euro
SEO base e analytics	700 euro
Formazione proprietario	400 euro
Soft launch, go-live e supporto iniziale	800 euro
Buffer minimo	200 euro
Totale	10.000 euro

Costi ricorrenti annuali Shopify

Voce	Range annuo ipotetico
Canoni piattaforma	inclusi nel budget ricorrente
App essenziali	300-500 euro
Dominio/strumenti minori	100-300 euro
Piccola assistenza tecnica	600-1.200 euro
Margine per incrementi o strumenti	600-1.000 euro
Totale massimo	3.000 euro/anno

Custom

Voce	Range stimato
Setup iniziale	25.000-60.000 euro
Durata	4-8 mesi
Manutenzione annua	5.000-15.000 euro
Valutazione	Non compatibile con vincoli

WooCommerce

Voce	Range stimato
Setup iniziale	10.000-20.000 euro
Manutenzione/plugin/hosting annui	2.000-6.000 euro
Valutazione	Possibile ma più rischioso su manutenzione

3.1.9 9. Benefici attesi

Beneficio	Misura ipotetica
Copertura geografica	Ordini da città non servite dagli store
Visibilità digitale	Visite al sito e pagine prodotto
Relazione cliente	Iscrizioni newsletter
Dati commerciali	Prodotti più visti e conversioni
Vendite online	Numero ordini e ricavi
Efficienza catalogo	Modifiche prodotto eseguite internamente
Validazione canale	Break-even stimato 12-18 mesi

3.1.10 10. Rischi per alternativa

Alternativa	Rischi principali
Shopify	Costi app, dipendenza piattaforma, personalizzazione limitata, centralità
Custom	Costi fuori budget, tempi lunghi, manutenzione, dipendenza sviluppatore
WooCommerce	Hosting, plugin, sicurezza, aggiornamenti, centralità
Marketplace/social	Brand debole, dati limitati, dipendenza piattaforme
Do nothing	Crescita limitata e perdita opportunità digitali

3.1.11 11. Conclusione

Il Business Case conferma la convenienza dell'e-commerce proprietario e raccomanda Shopify come soluzione più adatta.

La scelta è forte ma non cieca: Shopify presenta limiti, ma nel contesto Surya offre il miglior equilibrio tra tempo, budget, rischio tecnico e autonomia operativa. Con 10.000 euro di setup e 3.000 euro annui ricorrenti, una soluzione custom sarebbe sproporzionata, mentre WooCommerce richiederebbe maggiore presidio tecnico.

3.2 Requirements Breakdown Structure - RBS

3.2.1 1. Premessa

La Requirements Breakdown Structure scompone gli obiettivi del progetto in requisiti funzionali e non funzionali. La RBS è coerente con:

- Avvio: 1 aprile 2026;
- Go-live: 1 giugno 2026;
- MVP: 10 settimane;
- Budget setup/lancio: 10.000 euro;
- Budget ricorrente: 3.000 euro/anno;
- Catalogo: 150 prodotti;
- Formazione: 1 persona interna.

3.2.2 2. RBS testuale gerarchica

1. Valutare la fattibilità economica e operativa dell'e-commerce

REQUISITI FUNZIONALI

- Analizzare motivazioni strategiche.
- Confrontare Shopify, custom, WooCommerce, marketplace/social commerce e do nothing.
- Stimare costi setup/lancio.
- Stimare costi ricorrenti annuali.
- Valutare break-even ipotetico 12-18 mesi.
- Definire raccomandazione finale.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Usare ipotesi economiche realistiche.
 - Evidenziare limiti del budget.
 - Motivare le scelte con criteri trasparenti.
 - Non presentare dati simulati come dati reali.
-

2. Progettare il modello operativo e-commerce

REQUISITI FUNZIONALI

- Definire gestione catalogo.
- Definire gestione ordini.
- Definire gestione spedizioni.
- Definire gestione resi.
- Definire responsabilità del proprietario formato.
- Definire supporto minimo esterno.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Processi semplici e documentati.
- Bassa dipendenza tecnica.
- Operatività sostenibile per una sola persona formata.

- Coerenza con il lavoro degli store fisici.
-

3. Realizzare MVP Shopify

REQUISITI FUNZIONALI

- Configurare ambiente Shopify.
- Selezionare tema adatto.
- Personalizzare elementi base del brand.
- Impostare menu e collezioni.
- Configurare checkout.
- Configurare pagamenti.
- Configurare spedizioni Italia.
- Attivare analytics.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Go-live entro 1 giugno 2026.
 - Costi di setup entro 10.000 euro.
 - Uso limitato di app a pagamento.
 - Esperienza mobile adeguata.
 - Manutenibilità da parte di utente non tecnico.
-

4. Integrare contenuti, catalogo, pagamenti e spedizioni

REQUISITI FUNZIONALI

- Caricare 150 prodotti.
- Definire titolo, descrizione, prezzo, immagini, varianti.
- Organizzare prodotti in collezioni.
- Configurare tariffe spedizione.
- Pubblicare policy resi.
- Completare ordini test.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Schede prodotto chiare.
 - Immagini coerenti almeno per il catalogo MVP.
 - Riduzione errori su prezzi e disponibilità.
 - Chiarezza per il cliente.
-

5. Formare il personale Surya

REQUISITI FUNZIONALI

- Formare 1 persona: Edoardo Caldari.
- Consegnare manuale operativo sintetico.
- Eseguire esercitazione su modifica prodotto.
- Eseguire esercitazione su gestione ordine.

- Eseguire esercitazione su lettura dashboard.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Formazione pratica.
 - Linguaggio non tecnico.
 - Autonomia su attività base.
 - Identificazione procedure di supporto esterno.
-

6. Lanciare e monitorare il canale online

REQUISITI FUNZIONALI

- Effettuare soft launch.
- Risolvere issue critiche.
- Pubblicare sito il 1 giugno 2026.
- Monitorare risultati per 2 settimane.
- Produrre report post-lancio.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Nessuna issue critica al go-live.
 - Monitoraggio semplice.
 - KPI comprensibili dalla proprietà.
 - Capacità di prendere decisioni post-lancio.
-

7. Predisporre evoluzioni future Multi-Canale


REQUISITI FUNZIONALI

- Definire roadmap futura.
- Valutare integrazione stock store fisici.
- Valutare newsletter avanzata.
- Valutare programma loyalty.
- Valutare multilingua e vendita internazionale.
- Valutare app recensioni.

REQUISITI NON FUNZIONALI

- Nessuna evoluzione deve bloccare il MVP.
- Priorità basata su valore e costo.
- Attenzione al budget ricorrente annuo.
- Crescita incrementale.

3.2.3 3. Diagramma RBS

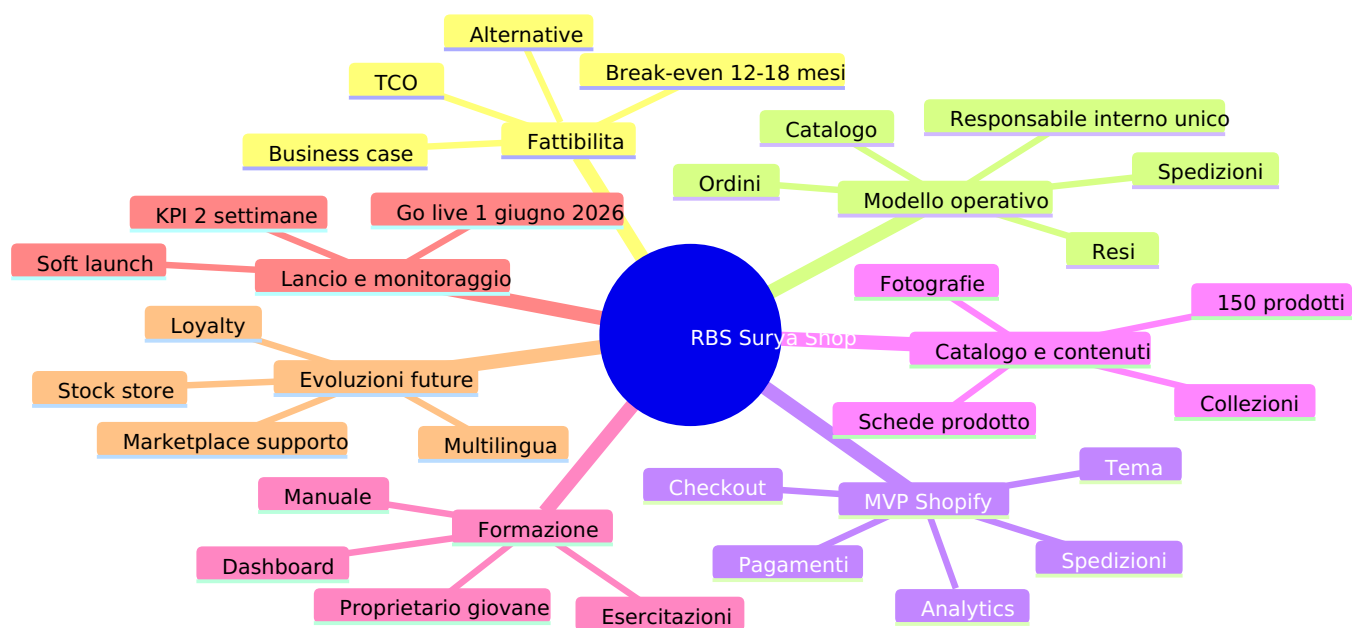

3.2.4 4. Collegamento con Shopify

La RBS conferma che i requisiti critici sono rapidità, semplicità, controllo dei costi e autonomia di una singola persona interna. Shopify risponde meglio di custom e WooCommerce perché riduce il lavoro tecnico e consente di concentrarsi su configurazione, contenuti e processi.

3.3 Project Management Life Cycle - PMLC

3.3.1 1. Scelta del ciclo di vita

Il progetto Surya Shop adotta un **ciclo di vita ibrido**: predittivo nella pianificazione e incrementale nella realizzazione operativa.

Il progetto deve rispettare vincoli stringenti:

- Avvio il 1 aprile 2026;
- Go-live il 1 giugno 2026;
- Durata MVP di 10 settimane, includendo stabilizzazione iniziale;
- Budget setup/lancio di 10.000 euro;
- Budget ricorrente annuale massimo di 3.000 euro;
- Una sola persona interna formata.

3.3.2 2. Motivazione dell'approccio ibrido

La componente predittiva è necessaria perché tempi e budget sono molto limitati. Occorre definire con precisione scope, milestone, responsabilità, rischi e criteri di accettazione.

La componente incrementale è necessaria perché catalogo, UX, contenuti e test richiedono revisione progressiva. Non è realistico definire in anticipo ogni dettaglio delle schede prodotto o della resa visiva del catalogo.

3.3.3 3. Fasi del ciclo di vita

3.1 Fase di valutazione

Periodo: **23 - 31 marzo 2026**.

Obiettivo: chiarire opportunità, vincoli e alternative.

Deliverable:

- Scoping meeting;
- Conditions of Satisfaction;
- POS;
- Criteri di valutazione alternative.

3.2 Fase di planning

Periodo: **1 - 7 aprile 2026**.

Obiettivo: consolidare piano, Business Case, WBS, rischi e responsabilità.

Deliverable:

- Business Case;
- RBS;
- WBS;
- Gantt;
- Risk Register;
- RASCI;
- PDS.

3.3 Fase di setup Shopify

Periodo: **8 - 21 aprile 2026.**

Obiettivo: configurare ambiente Shopify, scegliere tema, impostare struttura di base.

Deliverable:

- Ambiente Shopify;
- Tema selezionato;
- Navigazione;
- Collezioni;
- Impostazioni di Base.

3.4 Fase contenuti e catalogo

Periodo: **15 aprile - 15 maggio 2026.**

Obiettivo: preparare e caricare 150 prodotti.

Deliverable:

- Schede Prodotto;
- Immagini Selezionate;
- Categorie/Collezioni;
- Stima dei prezzi e Varianti;
- Catalogo MVP.

3.5 Fase pagamenti, spedizioni e compliance

Periodo: **22 aprile - 13 maggio 2026.**

Obiettivo: impostare checkout, pagamenti, spedizioni, resi, privacy e cookie.

Deliverable:

- Aprire un nuovo conto bancario;
- Pagamenti attivi;
- Tariffe spedizione;
- Policy resi;
- Privacy policy;
- Cookie policy;
- Condizioni vendita.

3.6 Fase di test

Periodo: **11 - 22 maggio 2026.**

Obiettivo: verificare catalogo, checkout, mobile, analytics e policy.

Deliverable:

- Report test;
- Ordini test;
- Issue log;
- Correzione problemi critici.

3.7 Formazione e soft launch

Periodo: **18 - 29 maggio 2026.**

Obiettivo: formare Edoardo ed effettuare soft launch.

Deliverable:

- Formazione completata;
- Manuale operativo;
- Soft launch;
- Feedback interno.

3.8 Go-live e stabilizzazione MVP

Periodo: **1 - 10 giugno 2026.**

Obiettivo: pubblicare il sito e stabilizzare il canale.

Deliverable:

- Go-live pubblico;
- Monitoraggio issue;
- Correzioni minori;
- Handover operativo.

3.9 Monitoraggio post-lancio

Periodo: **1-15 giugno 2026.**

Obiettivo: raccogliere dati iniziali e produrre report.

Deliverable:

- Report KPI post-lancio;
- Raccomandazioni operative;
- Backlog evolutivo.

3.3.4 4. Perché non waterfall puro

Un waterfall puro sarebbe troppo rigido perché:

- le schede prodotto richiedono revisione;
- le immagini possono non essere uniformi;
- il layout mobile va testato;
- il catalogo può richiedere sostituzioni;
- possono essere introdotte feature successive per migliorare issue.

3.3.5 5. Perché non agile puro

Un agile puro sarebbe rischioso perché:

- il budget è molto contenuto (pagamento a misura e tassi variabili);
- il go-live è fissato;
- le risorse interne sono limitate;
- una sola persona sarà formata;
- le funzionalità non essenziali devono essere escluse;
- serve forte controllo dello scope.

3.3.6 6. Rilascio incrementale

Step	Data/periodo	Obiettivo
MVP interno	Maggio 2026	Sito configurato e catalogo caricato
Soft launch	25 - 29 Maggio 2026	Test controllato
Go-live	1 Giugno 2026	Pubblicazione
Stabilizzazione	1 - 10 Giugno 2026	Correzioni minori
Monitoraggio	1 - 15 Giugno 2026	KPI e report
Roadmap futura	da metà Giugno 2026	Evoluzioni prioritarie

3.3.7 7. Coerenza con Surya

Surya non ha un reparto IT interno e forma una sola persona con competenze informatiche nella media. Il ciclo di vita ibrido consente di mantenere il progetto semplice, controllato e orientato al rilascio.

Shopify è coerente con questo ciclo perché consente configurazione rapida, limitata manutenzione tecnica e gestione ordinaria accessibile.

3.4 Work Breakdown Structure - WBS

3.4.1 1. Premessa

La WBS scompone il lavoro del progetto Surya Shop in attività gestibili. Le priorità sono classificate con metodo MoSCoW:

- **Must:** indispensabile per il MVP.
- **Should:** importante ma non bloccante.
- **Could:** utile ma rimandabile.
- **Won't have:** escluso dal MVP.

La WBS è costruita su un progetto con: avvio 1 aprile 2026, go-live 1 giugno 2026, setup/lancio con budget target 10.000 euro.

3.4.2 2. WBS gerarchica

1. Initiating e scoping

- 1.1 Analisi stakeholder — Must
- 1.2 Meeting di scoping — Must
- 1.3 Conditions of Satisfaction — Must
- 1.4 POS — Must

2. Business Case e scelta soluzione

- 2.1 Analisi alternative — Must
- 2.2 Analisi do nothing — Must
- 2.3 Matrice ponderata — Must
- 2.4 TCO stimato — Must
- 2.5 Raccomandazione Shopify — Must

3. Planning

- 3.1 RBS — Must
- 3.2 WBS — Must
- 3.3 Stime tempi/costi/risorse — Must
- 3.4 Gantt — Must
- 3.5 Risk Register — Must
- 3.6 RASCI — Must
- 3.7 Piano comunicazione — Must
- 3.8 PDS — Must

4. Setup Shopify

- 4.1 Configurazione ambiente — Must
- 4.2 Scelta tema — Must
- 4.3 Adattamento base brand — Must
- 4.4 Menu e collezioni — Must
- 4.5 Pagine istituzionali — Must
- 4.6 Checkout — Must
- 4.7 Personalizzazione avanzata tema — Won't have

5. Catalogo e contenuti

- 5.1 Struttura catalogo — Must
- 5.2 Selezione 150 prodotti — Must

- 5.3 Template scheda prodotto — Must
- 5.4 Caricamento prodotti — Must
- 5.5 Revisione immagini — Must
- 5.6 Storytelling essenziale — Should
- 5.7 Lookbook avanzato — Could

6. Pagamenti, spedizioni e policy

- 6.1 Pagamenti — Must
- 6.2 Spedizioni Italia — Must
- 6.3 Policy resi — Must
- 6.4 Condizioni vendita — Must
- 6.5 Email transazionali base — Should
- 6.6 Vendita internazionale — Won't have

7. GDPR, SEO e analytics

- 7.1 Privacy policy — Must
- 7.2 Cookie policy/banner — Must
- 7.3 SEO base — Must
- 7.4 Analytics — Must
- 7.5 Search Console — Should
- 7.6 SEO editoriale avanzata — Could

8. Test

- 8.1 Test checkout — Must
- 8.2 Test pagamenti — Must
- 8.3 Test spedizioni — Must
- 8.4 Test mobile — Must
- 8.5 Test contenuti — Must
- 8.6 Test utenti estesi — Could

9. Formazione

- 9.1 Manuale sintetico — Must
- 9.2 Formazione proprietario — Must
- 9.3 Esercitazione catalogo — Must
- 9.4 Esercitazione ordini — Must
- 9.5 Formazione team esteso — Won't have

10. Lancio e monitoraggio

- 10.1 Piano lancio — Must
- 10.2 Soft launch — Must
- 10.3 Go-live 1 giugno 2026 — Must
- 10.4 Monitoraggio 2 settimane — Must
- 10.5 Report post-lancio — Must
- 10.6 Closing — Must

11. Evoluzioni future

- 11.1 Integrazione stock fisico — Could
- 11.2 Loyalty — Could
- 11.3 Multilingua — Could

11.4 App recensioni – Could

11.5 Marketplace complementari – Could


3.4.3 3. Tabella WBS

La tabella seguente riporta le attività principali della WBS, non l'elenco completo.

ID	Attività	Priorità	Deliverable	Responsabile
1.1	Analisi stakeholder	Must	Mappa stakeholder	PM
1.3	Conditions of Satisfaction	Must	CoS approvate	PM
1.4	POS	Must	POS approvato	PM
2.1	Analisi alternative	Must	Confronto soluzioni	Business Analyst
2.4	TCO stimato	Must	Stima costi	Business Analyst
2.5	Raccomandazione Shopify	Must	Decisione motivata	PM
3.1	RBS	Must	RBS	Business Analyst
3.2	WBS	Must	WBS	PM
3.4	Gantt	Must	Piano temporale	PM
3.5	Risk Register	Must	Registro rischi	PM
4.1	Configurazione Shopify	Must	Ambiente attivo	Shopify Specialist
4.2	Scelta tema	Must	Tema selezionato	UX/UI Designer
4.4	Menu e collezioni	Must	Navigazione	Shopify Specialist
5.2	Selezione 150 prodotti	Must	Lista prodotti	E-commerce specialist
5.4	Caricamento prodotti	Must	Catalogo MVP	E-commerce specialist + Content Specialist
5.5	Revisione immagini	Must	Immagini validate	Content Specialist
6.1	Pagamenti	Must	Checkout pagamenti	Shopify Specialist
6.2	Spedizioni Italia	Must	Tariffe attive	Shopify Specialist
6.3	Policy resi	Must	Policy pubblicata	Legal/GDPR
7.1	Privacy policy	Must	Documento pubblicato	Legal/GDPR
7.3	SEO base	Must	Metadata essenziali	Marketing Specialist
7.4	Analytics	Must	Tracciamento attivo	Marketing Specialist
8.1	Test checkout	Must	Ordini test	Shopify Specialist
8.4	Test mobile	Must	Checklist mobile	UX/UI Designer
9.1	Manuale sintetico	Must	Manuale operativo	PM
9.2	Formazione proprietario	Must	Sessione completata	Shopify Specialist
10.2	Soft launch	Must	Feedback interno	PM

ID	Attività	Priorità	Deliverable	Responsabile
10.3	Go-live	Must	Sito pubblico	E-commerce specialist
10.5	Report post-lancio	Must	Report 2 settimane	PM

3.4.4 4. Diagramma WBS



3.5 Stime tempi, risorse e costi

3.5.1 1. Premessa

Le stime sono ipotesi didattiche costruite in modo realistico rispetto allo scope MVP. Il progetto prevede:

- Avvio: 1 aprile 2026;
- Go-live: 1 giugno 2026;
- Durata MVP: 10 settimane, includendo stabilizzazione iniziale;
- Monitoraggio post-lancio: 2 settimane;
- Budget setup/lancio: 10.000 euro;
- Budget massimo ricorrente: 3.000 euro/anno;
- Catalogo MVP: 150 prodotti;
- Formazione: 1 persona.

3.5.2 2. Metodo di stima

È usata una stima **consensus-based**, ispirata alla Delphi technique (consenso formale anonimo, basato su un gruppo di esperti), con contributo di:

- Project Manager;
- Business Analyst;
- Shopify Specialist;
- E-commerce Specialist;
- UX/UI Designer;
- Content/Product Specialist;
- SEO/Marketing Specialist;
- Legal/GDPR Consultant;
- Proprietà Surya.

La stima privilegia uno scope essenziale e riduce al minimo attività non indispensabili.

3.5.3 3. Definition of Done

Un'attività è completata quando:

- Il deliverable è prodotto;
- Il responsabile lo ha verificato;
- Eventuale approvazione richiesta è ricevuta;
- Non restano issue critiche;
- La documentazione minima è aggiornata;
- Il task è in stato `Done` nel Trello.

3.5.4 4. Risorse umane

Ruolo	Responsabilità	Ore stimate
Project Manager	Governance, tempi, rischi, report	35
Business Analyst	Requisiti e Business Case	20
Shopify Specialist	Setup, checkout, pagamenti, spedizioni	55
UX/UI Designer	Tema e adattamenti base	20
Content/Product Specialist	Supporto schede e immagini	45
SEO/Marketing Specialist	SEO base e analytics	15
Legal/GDPR Consultant	Privacy, cookie, condizioni vendita	12
E-commerce Specialist	Catalogo, ordini, formazione	70
Store Manager	Feedback prodotti e stock	10
Totale		282 ore

Le ore del personale interno Surya sono considerate impegno organizzativo, non costo esterno diretto.

3.5.5 5. Stima ore per macro-attività

Macro-attività	Ore stimate
Scoping e POS	15
Business Case e alternative	20
Planning PM	25
Setup Shopify	45
UX/UI base	20
Catalogo e contenuti	75
Pagamenti, spedizioni, policy	25
GDPR, SEO e analytics	25
Test	25
Formazione	12
Soft launch e go-live	15
Closing e report	5
Totale	282

3.5.6 6. Budget setup/lancio

Macro-area	Importo ipotetico
Project Management e Business Analysis	1.200 euro
Configurazione Shopify	2.000 euro
Tema e UX base	1.000 euro
Supporto catalogo 150 prodotti	2.200 euro
Pagamenti, spedizioni e policy operative	800 euro
GDPR/cookie/condizioni vendita	700 euro
SEO base e analytics	700 euro
Formazione	400 euro
Soft launch, go-live e supporto iniziale	800 euro
Buffer minimo	200 euro
Totale	10.000 euro

3.5.7 7. Costi ricorrenti annuali

Voce	Range annuo ipotetico
Canoni piattaforma	compresi nel budget annuo
App essenziali	100-200 euro
Dominio e strumenti minori	50-200 euro
Piccola assistenza tecnica	200-500 euro
Margine per imprevisti/strumenti	1.000 euro
Massimo annuale	1.900 euro

La stima attuale dei costi ricorrenti è pari a circa 1.900 €/anno, mantenendosi sotto il limite massimo autorizzato di 3.000 €/anno.

1.900€ è la stima base mentre i 3.000€ è il tetto autorizzato.

3.5.8 8. Confronto Shopify, custom e WooCommerce

Voce	Shopify	Custom	WooCommerce
Setup MVP	10.000 euro	25.000 – 60.000 euro	10.000 – 20.000 euro
Durata	10 settimane	6 - 8 mesi	10 - 16 settimane
Ricorrenti annui	entro 3.000 €	5.000–15.000 euro	2.000 – 6.000 euro
Rischio tecnico	Basso/medio	Alto	Medio
Autonomia interna	Alta	Bassa/media	Media
Coerenza con risorsa unica	Alta	Bassa	Media
Prevedibilità	Alta	Bassa	Media

3.5.9 9. Perché Shopify è più prevedibile

Shopify è più prevedibile perché molte funzionalità critiche sono già disponibili:

- Checkout;
- Gestione catalogo;
- Ordini;
- Pagamenti;
- Temi;
- App;
- Ruoli;
- Analytics base.
- App di integrazione (corriere, marketing, newsletter)

Una soluzione custom richiederebbe sviluppo, test e manutenzione di molte componenti, aumentando tempi e costi. WooCommerce è più accessibile del custom, ma richiede maggiore presidio tecnico su hosting, plugin, sicurezza e aggiornamenti con una minore integrazione di app.

3.5.10 10. Conclusione

La stima conferma che **Shopify** è l'unica soluzione pienamente coerente con budget, tempi e risorse interne. Il progetto deve rimanere strettamente orientato al MVP: 150 prodotti, checkout funzionante, pagamenti, spedizioni, analytics e formazione del proprietario giovane.

3.6 Gantt e Project Network

3.6.1 1. Premessa

La pianificazione considera:

- Avvio operativo: 1 aprile 2026;
- Go-live pubblico: 1 giugno 2026;
- Durata MVP: 10 settimane, con go-live in settimana 9 e stabilizzazione iniziale fino al 10 giugno;
- Monitoraggio post-lancio: 1 - 15 giugno 2026.

Il progetto è pianificato con attività parzialmente sovrapposte per rispettare tempi e budget.


3.6.2 2. Milestone

ID	Milestone	Data
M1	POS approvato	31 marzo 2026
M2	Avvio progetto	1 aprile 2026
M3	Shopify confermato	7 aprile 2026
M4	Setup Shopify base completato	21 aprile 2026
M5	Pagamenti/spedizioni configurati	8 maggio 2026
M6	Catalogo MVP completato	15 maggio 2026
M7	Test checkout completati	22 maggio 2026
M8	Formazione completata	22 maggio 2026
M9	Soft launch	25 maggio 2026
M10	Go-live pubblico	1 giugno 2026
M11	Stabilizzazione MVP completata	10 giugno 2026
M12	Report post-lancio	15 giugno 2026

3.6.3 3. Attività, durata e dipendenze

ID	Attività	Periodo	Durata	Dipendenze
A1	Kick-off e planning sintetico	1 - 7 aprile	1 settimana	POS
A2	Business Case e scelta Shopify	1 - 7 aprile	1 settimana	POS, input da A1
A3	Setup Shopify base	8 - 21 aprile	2 settimane	A2
A4	Scelta tema e UX base	8 - 21 aprile	2 settimane	A2
A5	Struttura catalogo	8 - 14 aprile	1 settimana	A2
A6	Preparazione/ caricamento 150 prodotti	15 aprile - 15 maggio	4,5 settimane	A5
A7	Pagamenti e spedizioni	22 aprile - 8 maggio	2,5 settimane	A3
A8	GDPR, cookie e condizioni vendita	22 aprile - 8 maggio	2,5 settimane	A1
A9	SEO base e analytics	6 - 15 maggio	1,5 settimane	A3, A6 parziale
A10	Test checkout, mobile e contenuti	11 - 22 maggio	2 settimane	A4, A5, A7, A8, A9 parziale
A11	Formazione proprietario	18 - 22 maggio	1 settimana	A3, A6 parziale
A12	Soft launch	25 - 29 maggio	1 settimana	A10, A11
A13	Go-live pubblico	1 giugno	1 giorno	A12
A14	Stabilizzazione MVP	1 - 10 giugno	1,5 settimane	A13
A15	Monitoraggio post-lancio	1 - 15 giugno	2 settimane	A13
A16	Closing report	15 giugno	1 giorno	A15

3.6.4.4. Diagramma Gantt

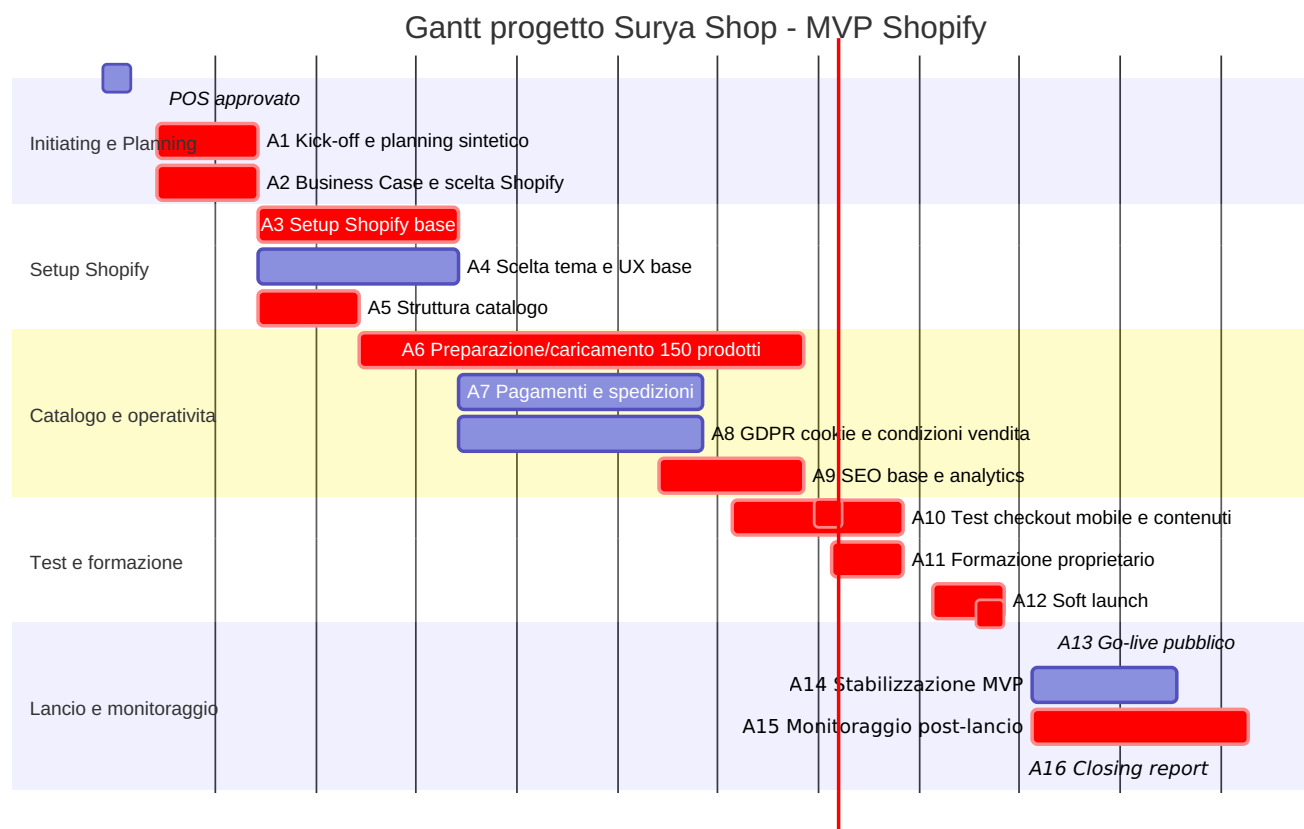

Il Gantt rappresenta la distribuzione temporale delle attività, mentre il PERT evidenzia le relazioni logiche tra attività.

Alcune dipendenze sono da intendersi come dipendenze parziali o progressive: in particolare, A9 e A11 possono iniziare quando il caricamento prodotti A6 è sufficientemente avanzato, e A10 può iniziare quando SEO/analytics A9 è configurata almeno nella sua parte essenziale.

3.6.5.5. Critical path senza interdipendenze

Il percorso critico realistico deve considerare anche le interdipendenze tra le attività.

Per questo motivo viene fornito il diagramma di PERT nella sezione sottostante.

3.6.6.6. Dipendenze principali

Catalogo

Il catalogo è critico perché 150 prodotti richiedono immagini, descrizioni, prezzi e varianti. Se il catalogo non è completo, il sito può essere tecnicamente pronto ma non pubblicabile.

Pagamenti e spedizioni

Checkout, pagamenti e spedizioni devono essere testati prima del soft launch. La configurazione dei pagamenti deve considerare anche i tempi tecnici di attivazione o verifica del conto bancario.

GDPR e policy

Privacy, cookie, resi e condizioni vendita sono condizioni di go-live.

Formazione

Poiché viene formata una sola persona, la formazione è una dipendenza critica. Senza autonomia minima del E-commerce specialist, il progetto non può essere considerato completato.

3.6.7 7. Analisi PERT e calcolo del percorso critico

3.6.8 7.1 Premessa metodologica

Per rafforzare la pianificazione temporale del progetto è stata applicata una logica PERT, utile per rappresentare le **dipendenze tra attività e calcolare il percorso critico**.

Il PERT viene utilizzato con una stima a tre punti:

$$TE = \frac{O + 4M + P}{6}$$

dove:


- **O** = durata ottimistica;
- **M** = durata più probabile;
- **P** = durata pessimistica;
- **TE** = durata attesa.

Le durate sono espresse in **giorni lavorativi equivalenti**. Il calcolo è coerente con la pianificazione complessiva del progetto, che prevede avvio il **1 aprile 2026**, go-live il **1 giugno 2026** e monitoraggio post-lancio fino al **15 giugno 2026**.

3.6.9 7.2 Tabella PERT delle attività

ID	Attività	Predecessori	O	M	P	TE
A1	Kick-off e planning sintetico	-	1	2	3	2,00
A2	Business Case e scelta Shopify	A1	2	3	5	3,17
A3	Setup Shopify base	A2	6	8	12	8,33
A4	Scelta tema e UX base	A2	5	8	12	8,17
A5	Struttura catalogo	A2	3	4	6	4,17
A6	Preparazione e/ caricamento 150 prodotti	A5	15	18	24	18,50
A7	Pagamenti e spedizioni	A3	5	7	10	7,17
A8	GDPR, cookie e condizioni vendita	A1	5	7	11	7,33
A9	SEO base e analytics	A3, A6	4	5	8	5,33
A10	Test checkout, mobile e contenuti	A4, A6, A7, A8, A9	4	5	8	5,33
A11	Formazione proprietario	A3, A6	2	3	5	3,17
A12	Soft launch	A10, A11	2	3	5	3,17
A13	Go-live pubblico	A12	0	0	0	0,00
A14	Stabilizzazione MVP	A13	5	7	10	7,17
A15	Monitoraggio o post-lancio	A13	8	10	14	10,33
A16	Closing report	A15	1	1	2	1,17

3.6.10 7.3 Diagramma PERT

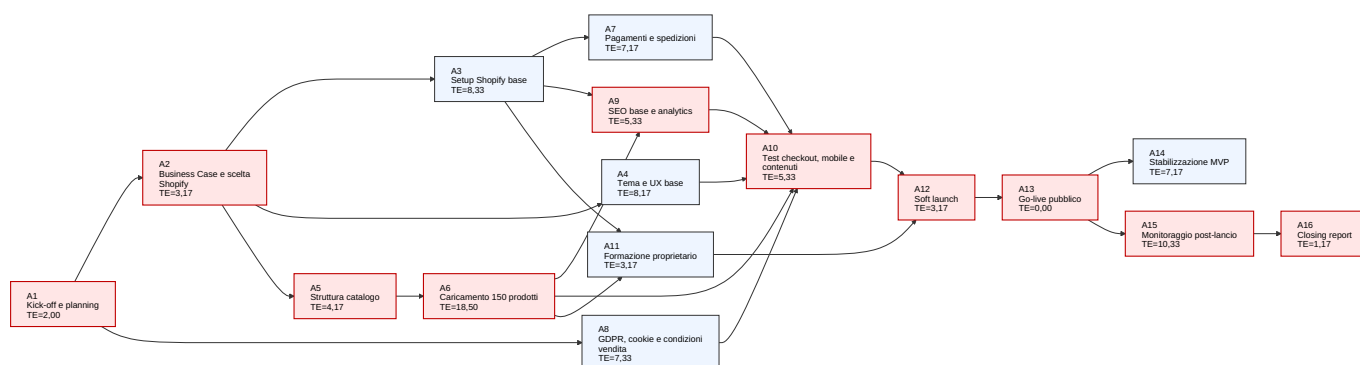

3.6.11 7.4 Critical Path

Il percorso critico fino al go-live pubblico è:

A1 → A2 → A5 → A6 → A9 → A10 → A12 → A13

Risultato più veritiero poiché considera anche le interdipendenze tra le attività.

3.6.12 7.5 Interpretazione PERT

Il percorso critico evidenzia che il principale vincolo del progetto non è la configurazione tecnica di Shopify, ma la preparazione del catalogo e il completamento delle attività necessarie al test e al go-live.

Le attività più critiche sono:

- A5 - Struttura catalogo: Se la struttura del catalogo non viene definita rapidamente, il caricamento dei 150 prodotti slitta;
- A6 - Preparazione/caricamento 150 prodotti: È l'attività più lunga e delicata. Fotografie, descrizioni, prezzi e varianti devono essere gestiti con disciplina;
- A9 - SEO base e analytics: Dipende dal catalogo e deve essere completata prima dei test finali;
- A10 - Test checkout, mobile e contenuti: È una barriera di qualità prima del soft launch;
- A12 - Soft launch: Serve a validare il sito prima della pubblicazione pubblica;
- A15 - Monitoraggio post-lancio: È critico per il closing complessivo, perché il report finale dipende dalla raccolta dei dati delle prime due settimane.

A15 non appartiene al percorso critico fino al go-live, ma è critica per la chiusura progettuale e per il report finale.

4. Governance e controllo

4.1 Analisi dei rischi

4.1.1 1. Metodologia

L'analisi utilizza una matrice probabilità/impatto da 1 a 5.

Valore	Probabilità	Impatto
1	Molto bassa	Trascurabile
2	Bassa	Limitato
3	Media	Moderato
4	Alta	Significativo
5	Molto alta	Critico

Livello rischio = Probabilità x Impatto.

Livello	Categoria
1 - 5	Basso
6 - 10	Medio
11 - 15	Alto
16 - 25	Critico

4.1.2.2. Risk Register

ID	Rischio	Prob.	Imp.	Livello	Categoria	Mitigazione	Owner
R1	Catalogo prodotti incompleto	4	5	20	Critico	Selezione anticipata, template schede, priorità ai prodotti pronti	E-commerce specialist
R2	Fotografie non coerenti	4	4	16	Critico	Usare standard minimo e rimandare prodotti non idonei	Content Specialist
R3	Sottostima lavoro contenuti stico	4	4	16	Critico	Limitare descrizioni, usare template, controlli settimanali	PM
R4	Budget setup insufficiente	3	5	15	Alto	congelare le funzionalità Could, evitare custom, usare tema standard	PM
R5	Budget ricorrente oltre 3.000 euro	3	4	12	Alto	App approval, revisione costi annuali, limitare app	PM
R6	Una sola persona formata	4	4	16	Critico	Manuale operativo, video guida, supporto esterno leggero	PM

ID	Rischio	Prob.	Imp.	Livello	Categoria	Mitigazione	Owner
R7	Resistenza operativa interna	3	3	9	Medio	Formazione pratica e processi semplici	Proprietà Surya
R8	Problemi GDPR/cookie	3	5	15	Alto	Coinvolgere consulente legale entro aprile	Legal/GDPR
R9	Problemi pagamento	2	5	10	Medio	Ordini test e fallback metodo pagamento	Shopify Specialist
R10	Problemi spedizione/resi	3	4	12	Alto	Policy chiare e test tariffe	Shopify Specialist
R11	Dipendenza da Shopify	3	3	9	Medio	Export dati, documentazione, limitare personalizzazioni	PM
R12	Personalizzazione limitata	3	3	9	Medio	Accettare tema MVP, roadmap futura	UX/UI
R13	Traffico iniziale insufficiente	4	4	16	Critico	Newsletter, social organico, campagne leggere, SEO base	Marketing
R14	Stock non sincronizzato con store fisici	4	4	16	Critico	Stock dedicato aggiornamento manuale giornaliero	E-commerce specialist

ID	Rischio	Prob.	Imp.	Livello	Categoria	Mitigazione	Owner
R15	Ritardi fornitore	3	4	12	Alto	Milestone brevi e deliverabili settimanali	PM
R16	Scope creep	4	5	20	Critico	Change control, MoSCoW, esclusione loyalty/multilingua	PM
R17	Aspettative irrealistiche ricavi	3	4	12	Alto	Break-even 12-18 mesi, KPI realistici	PM
R18	Errori prezzi/varianti	3	4	12	Alto	Revisione campione, checklist catalogo	E-commerce specialist
R19	Mobile experience debole	3	4	12	Alto	Test mobile obbligatorio	UX/UI
R20	Customer care non strutturato	3	3	9	Medio	FAQ e template risposta	E-commerce specialist

4.1.3 3. Analisi rischi per alternativa

Alternativa	Rischio tecnico	Rischio economico	Rischio operativo	Valutazione
Shopify	Basso/medio	Medio	Medio	Raccomandato con controllo app e scope
Custom	Alto	Molto alto	Alto	Non compatibile con vincoli
WooCommerce	Medio	Medio/alto	Medio/alto	Richiede presidio tecnico
Marketplace/social	Basso	Medio	Medio	Supporto utile, non proprietario
Do nothing	Basso tecnico	Basso breve termine	Alto strategico	Non raccomandato

4.1.4 4. Strategie di mitigazione

Strategia	Applicazione
Evitare	Escludere custom, loyalty, multilingua, integrazione POS dal MVP
Mitigare	Template catalogo, test, formazione, checklist
Trasferire	Usare Shopify per ridurre gestione tecnica
Accettare	Limiti di personalizzazione e canoni ricorrenti
Monitorare	Issue log, report settimanale, KPI post-lancio

4.1.5 5. Rischi prioritari

I rischi da monitorare ogni settimana sono:

1. Catalogo incompleto;
2. Scope creep;
3. Budget ricorrente oltre 3.000 euro;
4. Una sola persona formata;
5. Stock non sincronizzato;
6. Traffico iniziale basso;
7. GDPR/cookie.

4.2 Matrice responsabilità RASCI

4.2.1 1. Spiegazione RASCI

La matrice RASCI assegna ruoli e responsabilità.

Sigla	Significato	Descrizione
R	Responsible	Esegue l'attività
A	Accountable	Approva e ha responsabilità finale
S	Support	Supporta
C	Consulted	Viene consultato
I	Informed	Viene informato

4.2.2 2. Ruoli

Sigla	Ruolo
PS	Proprietà Surya
ES	E-commerce Specialist
PM	Project Manager
BA	Business Analyst
SS	Shopify Specialist
UX	UX/UI Designer
CS	Content Specialist
MS	Marketing Specialist
LG	Legal/GDPR Consultant
SM	Store Manager

4.2.3 3. Matrice RASCI

Attività	PS	ES	PM	BA	SS	UX	CS	MS	LG	SM
Approvazione POS	A	C	R	S	I	I	I	I	I	I
Business Case	A	C	R	R	C	C	C	C	I	I
Analisi alternative	A	C	R	R	C	C	I	C	I	I
Scelta Shopify	A	C	R	S	C	C	I	I	I	I
PDS	A	C	R	S	C	C	C	C	C	I
WBS e Gantt	I	C	A/R	S	C	I	C	I	I	I
Risk Register	I	C	A/R	S	C	C	C	C	C	I
Setup Shopify	I	C	A	I	R	S	I	I	I	I
Scelta tema	A	C	C	I	S	R	C	C	I	I
Adattamento brand	A	C	C	I	S	R	C	C	I	I
Strutturazione catalogo	C	A/R	C	S	S	I	S	I	I	C

Attività	PS	ES	PM	BA	SS	UX	CS	MS	LG	SM
Selezione e 150 prodotti	C	A/R	I	I	I	I	S	I	I	S
Schede prodotto	C	A/R	C	I	I	I	S	I	I	C
Caricamento prodotti	I	A/R	C	I	S	I	S	I	I	I
Pagamenti	I	C	A	I	R	I	I	I	I	I
Spedizioni	I	C	A	I	R	I	I	I	I	C
Policy resi	A	R	C	I	S	I	I	I	C	C
Privacy e cookie	A	C	C	I	S	I	I	I	R	I
SEO base	I	C	C	I	S	C	S	R	I	I
Analytics	I	C	A	I	S	I	I	R	I	I
Test checkout	I	C	A	I	R	S	I	I	I	I
Test mobile	I	C	A	I	S	R	I	I	I	I
Test continui	C	A/R	C	I	I	C	S	C	I	C

Attività	PS	ES	PM	BA	SS	UX	CS	MS	LG	SM
Formazione proprietario	I	R	A	I	R	I	S	I	I	I
Soft launch	A	R	R	I	S	S	S	S	C	C
Go-live	A	R	R	I	S	S	S	S	C	I
Monitoraggio KPI	I	R	A	I	S	I	I	R	I	I
Closing report	A	C	R	S	C	C	C	C	C	I

4.2.4 4. Logica delle responsabilità

La proprietà mantiene accountability strategica su budget, scelta Shopify e go-live.

L'E-commerce specialist è il referente operativo interno e diventa la figura chiave dopo il lancio.

Il Project Manager governa il progetto.

Shopify Specialist, UX/UI Designer, Content Specialist, Marketing Specialist e Legal/GDPR Consultant forniscono competenze specialistiche limitate allo scope MVP.

4.2.5 5. Attività con approvazione formale

- POS;
- Business Case;
- PDS;
- Scelta Shopify;
- Tema;
- Catalogo MVP;
- Privacy/cookie;
- Go-live;
- Report finale.

4.3 Piano comunicazione e Scope Change Management

4.3.1 1. Piano comunicazione

Il piano comunicazione definisce flussi informativi, canali, frequenza e responsabilità.

Poiché il progetto è breve e il budget è contenuto, la comunicazione deve essere semplice, rapida e documentata.

4.3.2 2. Stakeholder e comunicazioni

Stakeholder	Informazione	Canale	Frequenza	Responsabile
Proprietà Surya	Stato progetto, budget, decisioni	Meeting/report	Settimanale	PM
E-commerce specialist	Task operativi, catalogo, ordini	Trello/chat/call	Giornaliero	PM
Store Manager	Prodotti e disponibilità	Messaggio/call breve	Quando necessario	E-commerce specialist
Shopify Specialist	Setup e issue tecniche	Trello/call tecnica	2 volte settimana	PM
UX/UI Designer	Tema e mobile	Figma/call	A milestone	PM
Content Specialist	Schede e immagini	Foglio catalogo	2 volte settimana	E-commerce specialist
Marketing Specialist	SEO e analytics	Call breve	Settimanale a maggio	PM
Legal/GDPR	Policy e cookie	Email/documenti	A milestone	PM

4.3.3 3. Meeting

Meeting	Frequenza	Durata	Partecipanti	Obiettivo
Status meeting	Settimanale	30 min	PM, proprietà, E-commerce specialist	Stato, rischi, decisioni
Technical check	2 volte/settimana	20 min	PM, Shopify Specialist	Setup e issue
Catalog review	2 volte/settimana	20 min	E-commerce specialist, Content Specialist	Avanzamento prodotti
Go-live readiness	Ultima settimana maggio	45 min	Core team	Verifica pubblicazione
Post-launch check	Dopo go-live	30 min	PM, E-commerce specialist	KPI e issue

4.3.4 4. Report

Report	Frequenza	Contenuto
Current Period Report	Settimanale	Task completati, issue, rischi, budget
Exception Report	Quando necessario	Deviazioni critiche
Go-live readiness report	29 maggio 2026	Stato finale prima del go-live
Post-launch report	15 giugno 2026	KPI e raccomandazioni

4.3.5 5. Escalation

Livello	Caso	Azione
1	Issue operativa	Gestione nel Trello
2	Issue che impatta milestone	PM + E-commerce specialist
3	Issue che impatta budget/go-live	Proprietà Surya

4.3.6 6. Regole comunicazioni urgenti

Le comunicazioni urgenti devono includere:

- Problema;
- Impatto;
- Owner;
- Decisione richiesta;
- Scadenza.

Esempio:

```
[URGENTE] Checkout non completa ordine test
Impatto: blocca soft launch.
Owner: Shopify Specialist.
Decisione richiesta: test metodo alternativo entro 24 ore.
```

4.3.7 7. Scope Change Management

Il progetto ha budget e tempi limitati. Ogni modifica oltre MVP deve essere gestita formalmente.

4.3.8 8. Processo change request

1. Descrizione richiesta.
2. Motivazione business.
3. Priorità MoSCoW.
4. Impatto su tempi.
5. Impatto su budget setup.
6. Impatto su budget annuale ricorrente.
7. Impatto su rischi.
8. Decisione: approvata, respinta, rinviata.

4.3.9 9. Change budget

Non è previsto un change budget automatico. Qualsiasi extra oltre i 10.000 euro deve essere approvato dalla proprietà.

Il budget annuale ricorrente di 3.000 euro è un limite rigido: app e strumenti ricorrenti devono essere selezionati con attenzione.

4.3.10 10. Esempi di change request

Richiesta	Valutazione	Decisione MVP
Programma loyalty	Utile ma non essenziale	Rinviata
Integrazione POS fisico	Complessa e costosa	Rinviata
Multilingua	Richiede contenuti e gestione	Esclusa
Vendita internazionale	Richiede fiscalità, spedizioni, resi	Esclusa
Personalizzazione avanzata tema	Aumenta tempi/costi	Limitata
App recensioni	Utile ma ricorrente	Valutare post-lancio
Marketplace complementare	Utile per traffico	Roadmap futura

4.4 Monitoraggio e Controllo di qualità

4.4.1 1. Premessa

Il monitoraggio e il controllo sono fasi dedicate alla verifica del rispetto di tempi, costi, scope e qualità. Il progetto ha vincoli molto chiari:

- go-live 1 giugno 2026;
- budget setup/lancio 10.000 euro;
- budget ricorrente massimo 3.000 euro/anno;
- 150 prodotti;
- una persona formata.

4.4.2 2. KPI di progetto

KPI	Descrizione	Target
Schedule Performance Index	Avanzamento rispetto al piano	$\geq 0,90$
Cost Performance Index	Valore prodotto rispetto al costo	$\geq 0,90$
Avanzamento WBS	Percentuale task completati	Coerente con Gantt e Pert
Task in ritardo	Attività oltre deadline	Massimo 3 critici
Issue aperte	Problemi non chiusi	Trend decrescente
Issue critiche	Bloccanti go-live	0 al 29 maggio
Completamento catalogo	Prodotti caricati su 150	150 entro 15 maggio
Test checkout	Ordini test completati	Almeno 3
Formazione	Persona formata	1/1 entro 22 maggio
Budget setup	Spesa setup/lancio	≤ 10.000 euro
Budget ricorrente annuo stimato	Costi annui previsti	≤ 3.000 euro

4.4.3 3. KPI business post-lancio

KPI	Descrizione
Visite	Sessioni sul sito
Conversion rate	Percentuale visitatori che acquistano
Carrello medio	Valore medio ordine
Ordini	Numero acquisti completati
Ricavi	Valore vendite online
CAC stimato	Costo acquisizione cliente, se campagne attive
Tasso reso	Percentuale ordini restituiti
Iscrizioni newsletter	Nuovi contatti raccolti
Vendite da campagne	Ordini attribuiti a campagne
Prodotti più visti	Interesse prodotto
Abbandono carrello	Carrelli non completati

I KPI post-lancio sono osservati per 2 settimane. Non servono a giudicare definitivamente il progetto, ma a identificare problemi iniziali e priorità.

4.4.4 4. Current Period Report

Il Current Period Report è settimanale.

Struttura

Sezione	Contenuto
Periodo	Settimana di riferimento
Attività completate	Task chiusi
Attività in corso	Task aperti
Issue	Problemi e owner
Rischi	Variazioni principali
Budget	Costi sostenuti
Prossime attività	Priorità
Decisioni	Punti da approvare

Condizione del 10 maggio 2026

Campo	Esempio
Periodo	4-10 maggio 2026
Attività completate	95 prodotti caricati, spedizioni configurate
Issue	12 immagini da sostituire
Rischio	Catalogo incompleto
Azione	Priorità ai prodotti con immagini pronte
Decisione	Escludere prodotti non pronti dal MVP

4.4.5 5. Cumulative Report

Il Cumulative Report riassume:

- Avanzamento WBS;
- Budget consumato;
- Milestone raggiunte;
- Rischi principali;
- Issue aperte;
- Prodotti caricati;
- Test completati;
- Readiness go-live.

4.4.6 6. Exception Report

L'Exception Report viene prodotto quando:

- Il budget setup rischia di superare 10.000 euro;
- I costi ricorrenti annui stimati superano 3.000 euro;
- Il go-live è a rischio;
- Il checkout non funziona;
- Il catalogo non raggiunge almeno 150 prodotti;
- GDPR/cookie non sono approvati;
- L'E-commerce specialist non completa la formazione.

4.4.7 7. Frequenza e responsabilità

Attività	Frequenza	Responsabile
Aggiornamento Trello	Giornaliera	Owner task
Review issue	2 volte/settimana	PM
Status report	Settimanale	PM
Budget review	Settimanale	PM
Catalog review	2 volte/settimana	E-commerce Specialist
Test review	Durante maggio	Shopify Specialist
Post-launch KPI	2 volte nella finestra 1 - 15 giugno	Marketing Specialist
Report finale	15 giugno	PM

4.4.8 8. Azioni correttive

Problema	Azione
Ritardo catalogo	Ridurre prodotti non pronti e sostituirli
Budget in aumento	Bloccare Could e app non essenziali
Ricorrenti oltre soglia	Eliminare app non necessarie
Checkout non funzionante	Priorità assoluta allo Shopify Specialist
GDPR in ritardo	Escalation alla proprietà
Formazione incompleta	Sessione aggiuntiva breve
Traffico basso	Social organico, newsletter, campagne leggere
Conversione bassa	Verifica UX, spedizioni, schede prodotto

4.5 Issue Log e Trello

4.5.1 1. Struttura Issue Log

L'Issue Log registra problemi, blocchi e anomalie. È fondamentale in un progetto breve, perché anche piccoli ritardi possono compromettere il go-live del 1 giugno 2026.

4.5.2 2. Campi

Campo	Descrizione
ID	Codice issue
Data	Data apertura
Descrizione	Problema
Priorità	Critica, alta, media, bassa
Impatto	Tempi, costi, qualità o scope
Owner	Responsabile
Stato	Colonna Trello
Deadline	Data risoluzione
Azione	Prossimo passo

4.5.3 3. Issue

ID	Data	Descrizione	Priorità	Impatto	Owner	Stato	Deadline	Azione
ISS-01	10/04/2026	Template scheda prodotto non approvato	Alta	Ritardo catalogo	Content Specialist	Review Surya	12/04	Approvazione rapida
ISS-02	17/04/2026	30 prodotti senza immagini idonee	Alta	Qualità catalogo	E-commerce Specialist	In Progress	24/04	Sostituire prodotti
ISS-03	22/04/2026	Varianti non uniformi	Media	Errori prodotto	E-commerce Specialist	In Progress	30/04	Normalizzare SKU
ISS-04	28/04/2026	App proposta supera budget ricorrente	Alta	Budget annuo	PM	Backlog	02/05	Valutare alternativa gratuita
ISS-05	04/05/2026	Policy resi incompleta	Alta	Compliance/go-live	Legal/GDPR	To Do	08/05	Revisione finale
ISS-06	08/05/2026	Tariffe spedizione da validare	Media	Checkout	Shopify Specialist	Testing	12/05	Ordini test
ISS-07	12/05/2026	Analytics non registra evento checkout	Alta	KPI	Marketing Specialist	In Progress	16/05	Verifica tracking

Tutte le issue in fase di closing sono state risolte.

4.5.4 4. Trello

Colonna	Significato
Backlog	Attività registrate ma non pianificate
To Do	Attività da eseguire nell'iterazione corrente
In Progress	Attività in lavorazione
Review Surya	Richiede approvazione Surya
Testing	Completata ma da verificare
Done	Completata secondo Definition of Done
Blocked	Bloccata da dipendenza o decisione

4.5.5 5. Regole WIP

Regola la quantità di flusso di lavoro massimo

Colonna	Limite
To Do	8
In Progress	4
Review Surya	4
Testing	4
Blocked	Review obbligatoria entro 24 ore

Con una sola persona interna formata, il WIP deve restare basso per evitare sovraccarico.

4.5.6 6. Criteri passaggio stati

Passaggio	Criterio
Backlog → To Do	Priorità confermata
To Do → In Progress	Owner assegnato
In Progress → Review Surya	Output pronto
Review Surya → Testing	Approvazione ricevuta
Testing → Done	Test superato
Qualsiasi → Blocked	Dipendenza non risolta
Blocked → In Progress	Blocco rimosso

4.5.7 7. Gestione blocchi

Un blocco deve indicare:

- Causa;
- Impatto;
- Owner;
- Decisione richiesta;
- Deadline.

Esempio:

```
ISS-08 - Catalogo fermo a 132 prodotti  
Causa: mancano immagini idonee.  
Impatto: rischio go-live.  
Owner: E-commerce Specialist.  
Azione: sostituire 18 prodotti con articoli già fotografati.  
Deadline: 19 maggio 2026.
```

5. Esecuzione e chiusura

5.1 Launching ed Execution

5.1.1 1. Composizione del project team

Ruolo	Responsabilità
Proprietà Surya	Sponsor, budget, approvazione go-live
E-commerce specialist	Referente operativo, catalogo, ordini, report
Project Manager	Governance, piano, rischi, issue
Business Analyst	Requisiti e Business Case
Shopify Specialist	Setup piattaforma, checkout, pagamenti
UX/UI Designer	Tema e mobile experience
Content/Product Specialist	Supporto schede prodotto e immagini
SEO/Marketing Specialist	SEO base, analytics e lancio
Legal/GDPR Consultant	Privacy, cookie e condizioni vendita
Store Manager	Feedback su prodotti e disponibilità

5.1.2 2. Kick-off meeting

Campo	Dettaglio
Data	1 aprile 2026
Luogo	Meeting nella sede operativa di surya
Partecipanti	Proprietà Surya, E-commerce specialist, PM, BA, Shopify Specialist, Content Specialist
Obiettivo	Avviare operativamente il progetto

Agenda

1. Conferma obiettivi.
2. Conferma budget.
3. Conferma go-live 1 giugno 2026.
4. Presentazione scope MVP.
5. Presentazione strumenti.
6. Ruolo dell' e-commerce specialist.
7. Avvio backlog operativo.

Sintesi

Il Project Manager ha confermato che il progetto sarà gestito come MVP essenziale. La proprietà ha ribadito che l'investimento deve restare contenuto e che Shopify è la soluzione preferita perché evita complessità tecnica.

L'E-commerce specialist viene identificato come referente operativo unico da formare (Edoardo).

5.1.3 3. Regole operative

Regola	Descrizione
Scope essenziale	Solo funzionalità Must nel MVP
Budget control	Nessuna app a pagamento senza approvazione
Backlog unico	Tutte le attività tracciate in Trello
Approvazioni rapide	Decisioni entro 48 ore per non ritardare il go-live
Single owner interno	L'E-commerce specialist centralizza operatività
Issue critiche	Escalation immediata al PM
Documentazione minima	Manuale sintetico e checklist operative

5.1.4 4. Strumenti di lavoro

Strumento	Uso
Trello	Task e issue
Google Drive/Notion	Documenti e manuali
Shopify Admin	Gestione shop
Figma	Review tema e mobile
Google Analytics/Search Console	Monitoraggio
Teams	Comunicazioni operative
Foglio catalogo	Stato prodotti e schede

Tutti gli strumenti nascono per semplificare e rendere agile il lavoro informatico.

Non vengono scelti strumenti enterprise o troppo complessi, perché introdurrebbero overhead di configurazione e formazione non coerente con il MVP.

5.1.5 5. Collaborazione Surya-fornitore

La collaborazione è organizzata così:

- Surya decide prodotti, prezzi, tono e approvazioni.
- L' E-commerce specialist gestisce catalogo e ordini.
- Il fornitore configura Shopify e supporta il setup.
- Il PM mantiene controllo su tempi, budget e rischi.
- Le evoluzioni future non entrano nel MVP senza change request.

5.1.6 6. Iterazioni operative

Iterazione 1 — 1-7 aprile

Obiettivi:

- Kick-off;
- Business Case;
- Conferma Shopify;
- Pianificazione sintetica.

Output:

- PDS;
- WBS;
- Gantt;
- Backlog.

Iterazione 2 — 8 - 21 aprile

Obiettivi:

- Setup Shopify;
- Scelta tema;
- Struttura catalogo;
- Navigazione base.

Output:

- Ambiente configurato;
- Tema selezionato;
- Collezioni impostate.

Iterazione 3 — 15 aprile - 3 maggio

Obiettivi:

- Preparare e caricare primo lotto prodotti;
- Definire pagamenti e spedizioni;
- Avviare GDPR.

Output:

- Almeno 70 prodotti caricati;
- Bozze policy;
- Impostazioni operative.

Iterazione 4 — 4 - 15 maggio

Obiettivi:

- Completare 150 prodotti;
- Attivare analytics;
- Completare SEO base.

Output:

- Catalogo MVP;
- Tracciamenti;
- Metadata principali.

Iterazione 5 — 11 - 22 maggio

Obiettivi:

- Test checkout;
- Test mobile;
- Test contenuti;
- Formazione E-commerce specialist.

Output:

- Ordini test;
- Issue log;
- Proprietario formato.

Iterazione 6 — 25 maggio - 1 giugno

Obiettivi:

- Soft Launch;
- Correzioni Finali;
- Go-live.

Output:

- Sito pubblico;
- Monitoraggio attivo.

5.1.7 7. Gestione contenuti

Flusso scheda prodotto:

1. Selezione prodotto;
2. Raccolta prezzo, materiali e varianti;
3. Scelta immagini;
4. Compilazione template;
5. Caricamento Shopify;
6. Revisione;
7. Pubblicazione.

Ogni prodotto deve avere almeno:

- Nome;
- Descrizione sintetica;
- Prezzo (calcolato);
- Immagine principale;
- Disponibilità;
- Collezione;
- Eventuali varianti.

5.1.8 8. Gestione test

Test obbligatori:

- Navigazione desktop;
- Navigazione mobile;
- Ricerca prodotto;
- Carrello;
- Checkout;
- Pagamento test;
- Spedizione;
- Email ordine;
- Cookie banner;
- Analytics.

5.1.9 9. Piano formazione

La formazione riguarda l'E-commerce specialist (Edoardo).

Moduli:

1. Accesso Shopify Admin;
2. Modifica prodotto;
3. Creazione prodotto;
4. Gestione ordine;
5. Gestione disponibilità;
6. Lettura dashboard;
7. Gestione issue e richiesta supporto.

La formazione è pratica: il partecipante deve modificare un prodotto e simulare la gestione di un ordine.

5.1.10 10. Modalità di lancio

Soft launch

Periodo: 25 - 29 maggio 2026.

Coinvolge proprietà, e-commerce specialist e alcuni utenti selezionati. Serve a individuare errori prima del go-live.

Go-live

Data: 1 giugno 2026.

Condizioni:

- Catalogo pronto;
- Checkout testato;
- Policy pubblicate;
- E-commerce specialist formato;
- Analytics attivo;
- Issue critiche chiuse.

Stabilizzazione

Periodo: 1 - 10 giugno 2026.

Obiettivo: correggere problemi minori e assistere l'E-commerce specialist nella gestione iniziale.

5.2 Closing

5.2.1 1. Premessa

Il closing report conclude la simulazione del progetto Surya Shop, finalizzato alla valutazione e pianificazione del lancio di un MVP e-commerce basato su Shopify.

Poiché il progetto ha natura didattica, i risultati riportati non devono essere interpretati come consuntivi aziendali reali, ma come una simulazione coerente con il piano di progetto, utile a verificare la solidità delle scelte effettuate, la gestione dei rischi e la sostenibilità della soluzione proposta.

Rispetto al piano iniziale, il progetto ha confermato la validità generale della scelta Shopify, ma ha evidenziato alcune criticità operative tipiche di un progetto e-commerce per una piccola realtà retail-artigianale. In particolare, sono emersi tre aspetti rilevanti: la qualità non uniforme di alcune immagini prodotto, il rischio di aumento dei costi ricorrenti dovuto all'uso di app aggiuntive e la necessità di rivedere alcune attività non essenziali per rispettare tempi e budget.

Queste criticità non hanno modificato la raccomandazione finale, ma hanno reso più evidente l'importanza di mantenere uno scope MVP controllato, distinguendo le funzionalità indispensabili da quelle rinviabili a una fase successiva.

I dati di closing sono costruiti come scenario simulato a fini didattici. Le criticità e le azioni correttive non rappresentano eventi aziendali certificati, ma ipotesi realistiche utilizzate per verificare la tenuta del piano di progetto e la coerenza delle decisioni manageriali.

5.2.2 2. Procedura di chiusura

La chiusura include:

1. Verifica deliverable;
2. Verifica criteri di accettazione;
3. Chiusura issue critiche;
4. Verifica formazione;
5. Handover all' Ecommerce-Specialist;
6. Report KPI post-lancio;
7. Roadmap futura;
8. Approvazione closing.

5.2.3 3. Attivazione

Nel caso Shopify, l'attivazione riguarda la messa online dello store configurato.

Elementi attivati:

- Storefront pubblico;
- Catalogo 150 prodotti;
- Checkout;
- Pagamenti;
- Spedizioni;
- Policy resi;
- Privacy e cookie;
- Analytics;
- E-commerce Specialist operativo e formato.

5.2.4 4. Accettazione deliverable

Deliverable	Stato simulato	Note
Business Case	Accettato	Shopify confermato
PDS	Accettato	Scope MVP rispettato
Shopify configurato	Accettato	Ambiente operativo
Tema e UX base	Accettato	Coerente con brand
Catalogo	Accettato	150 prodotti caricati
Pagamenti	Accettato	3 ordini test
Spedizioni/resi	Accettato	Policy pubblicate
GDPR/cookie	Accettato	Documenti attivi
Analytics	Accettato	Dashboard base
Formazione	Accettato	1 persona formata
Soft launch	Accettato	Issue critiche risolte
Go-live	Accettato	1 giugno 2026
Report post-lancio	Accettato	15 giugno 2026

5.2.5 5. Checklist finale

Controllo	Esito
Sito pubblico raggiungibile	OK
Navigazione desktop	OK
Navigazione mobile	OK
150 prodotti caricati	OK
Prezzi verificati	OK
Varianti verificate	OK
Checkout funzionante	OK
Ordini test completati	OK
Spedizioni configurate	OK
Policy resi pubblicata	OK
Privacy/cookie pubblicati	OK
Analytics attivo	OK
Proprietario formato	OK
Manuale consegnato	OK
Issue critiche chiuse	OK

5.2.6 6. Documentazione consegnata

- Business Case.
- POS.
- PDS.
- WBS.
- Gantt.
- Risk Register.
- RASCI.
- Piano comunicazione.
- Manuale operativo Shopify sintetico.
- Checklist scheda prodotto.
- Procedura gestione ordine.
- Procedura gestione reso.
- Report test.
- Report post-lancio.
- Roadmap evolutiva.

5.2.7 7. Formazione completata

La formazione riguarda una persona: il proprietario più giovane.

Moduli completati:

Modulo	Esito
Accesso Shopify Admin	Completato
Modifica prodotto	Completato
Creazione prodotto	Completato
Gestione ordine	Completato
Lettura dashboard	Completato
Richiesta supporto tecnico	Completato

5.2.8 8. Handover operativo

Responsabilità trasferite all'E-commerce Specialist:

- Aggiornare prodotti;
- Modificare immagini e descrizioni;
- Controllare ordini;
- Verificare disponibilità;
- Leggere dashboard;
- Segnalare issue;
- Coordinare piccole correzioni.

Responsabilità esterne residue:

- Modifiche tecniche avanzate;
- Nuove app;
- Evoluzioni funzionali;
- Problemi complessi di checkout;
- Campagne marketing strutturate.

5.2.9 9. Supporto post go-live

Periodo: 1-15 giugno 2026.

Attività:

- Monitoraggio ordini;
- Assistenza al proprietario;
- Correzioni minori;
- Verifica analytics;
- Controllo issue;
- Report KPI.

5.2.10 10. Audit post-implementazione

Domanda	Risposta simulata
Il go-live è stato rispettato?	Sì, go-live rispettato nella data pianificata
Il budget setup è stato rispettato?	Sì, 10.000 euro ipotetici
Il budget ricorrente è sostenibile?	Sì, entro 3.000 euro/anno se app controllate
Shopify è adeguato?	Sì, per MVP snello e gestione autonoma
La persona interna è autonoma?	Sì per attività base
I rischi principali sono stati gestiti?	Sì, con particolare attenzione a catalogo e scope
Sono emerse criticità?	Sì: stock manuale e traffico iniziale da costruire

5.2.11 11. Raccomandazioni future

- Migliorare fotografia prodotto.
- Consolidare SEO.
- Attivare newsletter.
- Pianificare campagne social leggere.
- Valutare app recensioni.
- Studiare integrazione stock store fisici.
- Valutare programma loyalty.
- Considerare marketplace come supporto.
- Valutare multilingua solo dopo validazione italiana.

5.2.12 12. Conclusione

Nello scenario simulato, il progetto MVP Surya Shop viene chiuso positivamente. Shopify si conferma la soluzione più coerente con vincoli di budget, tempi e risorse interne. La fase successiva dovrà concentrarsi su traffico, contenuti, stock e crescita progressiva.

5.3 Final Project Report

5.3.1 1. Sintesi esecutiva

Questa sezione rappresenta una simulazione di chiusura progettuale e non un consuntivo reale.

Il progetto *Progetto di valutazione, pianificazione e lancio dell'e-commerce Surya Shop* ha valutato la convenienza dell'apertura di un e-commerce proprietario per Surya Tesori Accessori e ha confrontato diverse alternative: Shopify, custom, WooCommerce, marketplace/social commerce e mantenimento del solo canale fisico.

La conclusione è che **conviene avviare il canale e-commerce** e che la soluzione raccomandata è **Shopify**.

La raccomandazione è basata sui vincoli aggiornati:

- Avvio progetto: 1 aprile 2026;
- Go-live: 1 giugno 2026;
- MVP: 10 settimane, includendo stabilizzazione;
- Monitoraggio post-lancio: 2 settimane;
- Budget setup/lancio: 10.000 euro;
- Budget massimo annuale ricorrente: 3.000 euro;
- Catalogo iniziale: 150 prodotti;
- Formazione: 1 persona interna;
- Break-even stimato: 12-18 mesi.

5.3.2 2. Obiettivi raggiunti

Obiettivo	Esito simulato
Valutare convenienza e-commerce	Raggiunto
Analizzare alternative	Raggiunto
Raccomandare soluzione	Shopify raccomandato
Definire modello operativo	Raggiunto
Configurare MVP Shopify	Raggiunto
Caricare catalogo iniziale	150 prodotti caricati
Configurare pagamenti/spedizioni	Raggiunto
Pubblicare policy GDPR/cookie	Raggiunto
Formare personale interno	1 persona formata
Effettuare soft launch	Raggiunto
Go-live	Raggiunto
Monitoraggio post-lancio	2 settimane completate

5.3.3 3. Alternative valutate

Shopify

Soluzione raccomandata. Offre il miglior equilibrio tra tempi, costi, rischio tecnico e autonomia. È particolarmente coerente con una piccola impresa senza reparto IT e con una sola persona interna da formare.

Custom

Non raccomandato. Pur offrendo personalizzazione, è incompatibile con budget, tempi e necessità di semplicità operativa.

WooCommerce

Alternativa valida ma meno adatta al caso Surya. Richiede maggiore attenzione a hosting, plugin, sicurezza e manutenzione.

Marketplace/social commerce

Utili come canali complementari, ma non sostituiscono un e-commerce proprietario perché limitano controllo su brand, dati e relazione cliente.

Do nothing

Non raccomandato. Evita costi immediati, ma limita crescita, dati e presidio digitale.

5.3.4 4. Decisione finale a favore di Shopify

Shopify è raccomandato perché:

- Riduce il time-to-market;
- Permette il go-live al 1 giugno 2026;
- Consente di rimanere nel budget setup di 10.000 euro;
- Può mantenere i costi ricorrenti entro 3.000 euro/anno se governato;
- Riduce il rischio tecnico;
- È gestibile da una persona con competenze informatiche medie;
- Offre temi, app, pagamenti, spedizioni e analytics;
- Consente un MVP e crescita progressiva;
- Mantiene più controllo rispetto a marketplace e social commerce.

I limiti sono riconosciuti: canoni ricorrenti, possibili costi app, dipendenza dalla piattaforma e minore libertà rispetto al custom. Tuttavia, questi limiti sono accettabili e più governabili rispetto ai rischi di sviluppo custom.

5.3.5 5. Risultati del progetto

Area	Risultato simulato
Piattaforma	Shopify
Catalogo	150 prodotti
Checkout	Funzionante
Ordini test	3 completati
Pagamenti	Attivi
Spedizioni	Italia configurata
Policy	Privacy, cookie, resi e condizioni vendita
Analytics	Attivo
Formazione	E-commerce Specialist formato
Soft launch	25-29 maggio 2026
Go-live	1 giugno 2026
Monitoraggio	1-15 giugno 2026

5.3.6 6. Confronto pianificato/consuntivo simulato

Elemento	Pianificato	Consuntivo simulato	Scostamento	Nota
Avvio	1 aprile 2026	1 aprile 2026	0	Avvio confermato
Go-live	1 giugno 2026	1 giugno 2026	0	Data rispettata grazie a controllo scope
Budget setup	10.000 euro	9.750 euro	-250 euro	Esclusa app non essenziale
Budget ricorrente annuo	max 3.000 euro	circa 1.900 euro	entro soglia	App avanzate rinviate
Catalogo	150 prodotti	150 prodotti	0 sul numero finale	30 prodotti rivisti, 18 sostituiti o corretti
Persone formate	1	1	0	Aggiunta checklist operativa
Ordini test	3	3	0	Un problema analytics corretto prima del go-live
Issue critiche al go-live	0	0	0	7 issue gestite durante l'esecuzione

Gli scostamenti quantitativi principali risultano contenuti, ma la simulazione ha evidenziato criticità operative rilevanti. In particolare, alcune schede prodotto hanno richiesto revisione delle immagini, una app è stata esclusa dal perimetro MVP per evitare aumento dei costi ricorrenti e il tracciamento analytics del checkout ha richiesto una correzione prima del go-live. Questi elementi non hanno modificato la raccomandazione finale, ma confermano l'importanza di controllo dello scope e monitoraggio operativo.

Scostamenti rispetto al piano

Area	Piano iniziale	Consuntivo simulato	Scostamento	Azione correttiva
Data go-live	1 giugno 2026	1 giugno 2026	Nessuno	Confermata la data grazie alla riduzione delle funzionalità non essenziali
Budget setup	€ 10.000	€ 9.750	- € 250	Evitata l'adozione di un'app non necessaria nel primo rilascio
Costi ricorrenti annui	Max € 3.000	Circa € 1.900	Entro soglia	Mantenute solo le app indispensabili per MVP
Prodotti caricati	150	150	Nessuno sul numero finale	18 schede prodotto sono state riviste per immagini non idonee
Qualità immagini	Immagini coerenti per tutto il catalogo	Qualità inizialmente non uniforme	Criticità parziale	Sostituzione o ritaglio delle immagini non coerenti
Funzionalità Could	Valutate se compatibili	Rinviate	Riduzione scope	Priorità assegnata a checkout, catalogo, pagamenti, spedizioni e conformità base
Formazione proprietario	1 sessione	1 sessione + mini checklist operativa	Leggero ampliamento	Crea checklist sintetica per gestione ordini e prodotti

I dati sono simulati e usati per finalità didattiche.

5.3.7.7. Benefici attesi

Beneficio	Descrizione
Copertura geografica	Vendita oltre Riccione, Misano e Cattolica
Canale proprietario	Controllo su brand, catalogo e dati
Storytelling	Racconto online di artigianalità e materiali
Dati commerciali	Visite, prodotti visti, ordini, conversioni
Efficienza	Catalogo aggiornabile dal proprietario formato
Marketing	Base per newsletter e campagne social
Validazione	Verifica convenienza entro 12-18 mesi

5.3.8 8. Limiti del progetto

Il MVP esclude:

- Multilingua;
- Vendita internazionale;
- Integrazione POS;
- Stock real-time;
- Loyalty;
- App recensioni avanzata;
- Shooting fotografico esteso;
- Campagne pubblicitarie rilevanti;
- Personalizzazioni custom avanzate.

Questi limiti sono scelte progettuali intenzionali per rispettare budget, tempi e capacità interna.

Criticità gestite durante la simulazione

Durante la simulazione sono state considerate alcune criticità operative, utili a rendere il closing più realistico e coerente con la natura del progetto.

La prima criticità riguarda il catalogo prodotti. Pur mantenendo l'obiettivo di 150 prodotti caricati, 18 schede hanno richiesto una revisione perché le immagini iniziali non erano pienamente coerenti per formato, illuminazione o qualità visiva. La criticità è stata gestita attraverso una selezione più rigorosa delle immagini e, dove possibile, tramite ritaglio o sostituzione. Questo conferma che, in un progetto e-commerce per prodotti artigianali o semi-artigianali, la qualità del contenuto visivo è una componente critica e non un'attività secondaria.

La seconda criticità riguarda i costi ricorrenti. Durante la valutazione operativa è emersa la possibilità di introdurre un'app aggiuntiva per funzionalità avanzate di marketing e automazione. Tuttavia, il relativo costo ricorrente avrebbe aumentato la dipendenza da strumenti esterni e ridotto il margine disponibile entro il tetto annuo previsto. Per questo motivo l'app è stata esclusa dal perimetro MVP e rinviata a una fase successiva, da valutare solo dopo i primi dati reali di traffico e vendita.

La terza criticità riguarda lo scope. Alcune funzionalità classificate come Could, pur interessanti dal punto di vista commerciale, avrebbero richiesto tempo aggiuntivo di configurazione e test. Per rispettare la data di go-live del 1 giugno 2026, il progetto ha mantenuto la priorità sulle funzionalità Must: catalogo navigabile, checkout funzionante, pagamenti, spedizioni, pagine informative, conformità base e tracciamento analytics.

5.3.9 9. Prossimi passi

Priorità	Azione
Alta	Monitorare ordini e analytics
Alta	Rafforzare schede prodotto
Alta	Migliorare immagini meno performanti
Alta	Attivare newsletter
Media	Avviare campagne social leggere
Media	Analizzare abbandono carrello
Media	Valutare app recensioni
Media	Definire processo stock con store fisici
Bassa	Valutare loyalty
Bassa	Valutare multilingua e internazionale

5.3.10 10. Raccomandazioni

10.1 SEO

Ottimizzare titoli, descrizioni, collezioni e immagini. La SEO deve valorizzare artigianalità, materiali e unicità.

10.2 Campagne social

Usare campagne leggere e misurabili, collegate a collezioni specifiche. Le campagne importanti devono essere finanziate con budget separato.

10.3 Stock store fisici

Nel MVP lo stock può essere gestito manualmente, ma nel medio periodo va valutata un'integrazione con gli store fisici.

10.4 Programma loyalty

Da valutare solo dopo aver validato ordini, traffico e processi base.

10.5 Internazionalizzazione

Da rinviare. Richiede lingua, spedizioni, resi, fiscalità e customer care dedicati.

5.3.11 11 Conclusione finale

La simulazione conferma Shopify come soluzione raccomandata per il lancio dell'e-commerce Surya Shop, soprattutto in relazione ai vincoli di budget, tempi e competenze interne disponibili. La piattaforma consente di realizzare un MVP funzionante entro la data prevista, mantenendo sotto controllo la complessità tecnica e permettendo al proprietario di gestire in autonomia le attività ordinarie.

Il progetto non è però privo di rischi. Le criticità emerse nella simulazione mostrano che la riuscita dell'iniziativa dipende in modo significativo dalla qualità del catalogo, dalla disciplina nella gestione dello scope e dal controllo dei costi ricorrenti. In particolare, la revisione di 18 schede prodotto e la scelta di escludere un'app aggiuntiva dal primo rilascio dimostrano l'importanza di prendere decisioni coerenti con la logica MVP.

La raccomandazione finale è quindi procedere con Shopify come piattaforma di lancio, mantenendo il primo rilascio essenziale e misurabile. Dopo il go-live, eventuali evoluzioni dovrebbero essere decise sulla base di dati concreti, come traffico, conversioni, ordini, richieste dei clienti e capacità interna di gestione.
